

【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：令和2年11月10日（令和2年11月20日公表）

策定の趣旨

- 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、県民生活に身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠です。

また、本格復興の着実な推進を、目に見える形で広く情報発信する必要があります。

このため、県では、県民生活に身近な社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通しについて情報提供を行うものです。

なお、記載している工程等は、様々な要因により変更となる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新していきます。

ロードマップの構成

◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

◆ 総括と市町村別の2種類で構成

- 1 総括表
 - ① 復旧・復興事業の動き
 - ② 分野別の着工・完成箇所割合
 - ③ 市町村別事業計画掲載箇所一覧
 - ④ 分野別整備スケジュール
 - ⑤（参考）市町村別工程表の見方
- 2 市町村別工程表
 - ① 各事業箇所位置図
 - ② 年度別整備スケジュール
 - ③ 完成箇所数割合
 - ④ 完成箇所一覧表

ロードマップの更新

◆ 更新頻度

原則、9月30日と3月31日を基準日として、最新のデータに更新しています。

今回は、令和2年11月10日を基準日として、データをお示ししています。

◆ 工程上の主要課題

- ① 施工条件の変化への対応
- ② 工事区間の一部における用地取得または補償物件への対応
- ③ 工事区間内における他事業又は関係者との調整

予定している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

◆ 情報発信

社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに公表したものと併せ、県のホームページに掲載しています。


(<https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/anzen/machizukuri/1002418/index.html>)

復旧・復興事業の動き

- ◆ 前回の公表時点（基準日：令和2年3月31日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を**工事の『着工』と『完成』**に着目し整理しています。


全箇所数：775箇所

◆ 着工箇所数



※ 着工：全箇所着工済み


◆ 完成箇所数

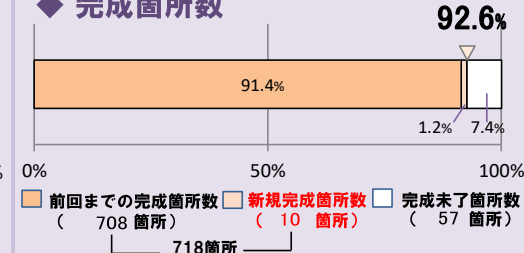

※ 完成：1.2ポイント増加し、全箇所の92.6%

分野別の完成箇所割合

- ◆ 社会資本の主要8分野における**分野別の『完成箇所』及び『工事中箇所』**の割合を整理しています。

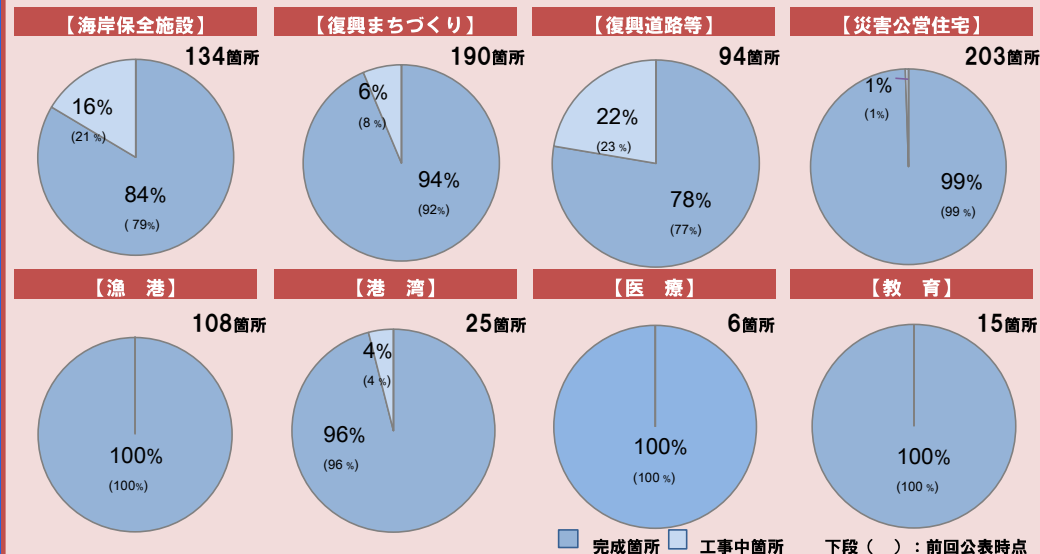

【お問合せ先】岩手県復興局まちづくり・産業再生課（019-629-6931）

【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：令和2年11月10日（令和2年11月20日公表）


市町村別 事業計画掲載箇所一覧（全775箇所）

市町村名	事業主体	海岸保全施設				復興まちづくり										復興道路等						災害公営住宅		漁港	港湾	医療	教育
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画整理		防災集団移転		漁業集落防災		津波復興 拠点	面整備計		まちづくり 連携道路	復興道路		復興支援道路		復興関連道路		箇所数	戸数	漁港数	地区数	箇所数	箇所数
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	区画数	団地数	区画数	地区数	区画数	地区数	地区数	区画数	箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数						
洋野町	県	6	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	0	-	-	2	2	-	-	1	2	-	-
	町	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	1	14	-		(国)1	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-
	計	6	-	1	7	-	-	-	-	-	1	14	-	1	14		1	-	-	2	2	1	4	9	2	-	-
久慈市	県	5	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	0	1	1	2	2	-	-	1	4	-	-
	市	-	-	2	2	-	-	-	-	4	15	-	4	15	-		(国)2	-	-	-	-	3	11	9	(国)1	-	-
	計	5	-	3	8	-	-	-	-	4	15	-	4	15	-		2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-
野田村	県	6	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	2	2	26	1	-	-	-
	村	-	-	-	-	1	124	2	38	2	15	-	5	177	-		(国)1	-	-	-	-	4	74	2	-	-	-
	計	6	2	-	8	1	124	2	38	2	15	-	5	177	2		1	-	-	1	2	6	100	3	-	-	-
普代村	県	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
	村	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		(国)3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	計	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		3	-	-	1	1	-	-	5	-	-	-
田野畑村	県	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
	村	-	-	1	1	-	-	-	-	2	61	-	2	61	-		(国)3	-	-	-	-	5	63	3	-	-	-
	計	2	-	2	4	-	-	-	-	2	61	-	2	61	3		3	-	-	1	3	5	63	4	-	-	-
岩泉町	県	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	0	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-
	町	-	-	1	1	-	-	-	-	1	59	-	1	59	-		(国)1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	2
	計	2	-	2	4	-	-	-	-	1	59	-	1	59	-		1	2	3	-	-	2	51	2	1	1	2
宮古市	県	13	2	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸道 路、宮古線 間断道路	1	1	3	3	3	12	349	3	7	-	-
	市	-	-	3	3	2	410	5	262	9	32	2	18	704	-		(国)7	-	-	-	-	16	417	15	(国)1	1	-
	計	13	2	4	19	2	410	5	262	9	32	2	18	704	7		8	1	3	3	3	28	766	18	8	1	-
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	0	1	1	-	-	8	297	4	-	1	-
	町	-	-	1	1	5	659	4	388	2	144	1	12	1,191	-		(国)2	-	-	-	-	10	343	2	-	-	1
	計	4	3	5	12	5	659	4	388	2	144	1	12	1,191	1		2	1	1	-	-	18	640	6	-	1	1
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	1	8	413	2	-	1	-
	町	-	-	-	-	4	967	17	422	4	12	2	27	1,401	-		(国)1	-	-	-	-	36	463	-	-	-	2
	計	2	1	2	5	4	967	17	422	4	12	2	27	1,401	1		1	-	-	1	1	44	876	2	-	1	2
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	三陸沿岸道 路、東北横 断自動車道 釜石秋田線	0	1	1	3	3	8	373	6	1	-	-
	市	-	-	7	7	4	1,056	11	124	14	89	2	31	1,269	-		(国)3	-	-	-	-	38	943	9	(国)1	-	4
	計	6	3	12	21	4	1,056	11	124	14	89	2	31	1,269	5		3	1	1	3	3	46	1,316	15	2	-	4
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	三陸沿岸 道路	0	-	-	2	2	10	511	6	6	-	-
	市	-	-	8	8	1	231	23	366	1	30	1	26	627	-		(国)2	-	-	-	-	17	290	16	(国)1	-	3
	計	7	3	13	23	1	231	23	366	1	30	1	26	627	5		2	-	-	2	2	27	801	22	7	-	3
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸 道路	0	-	-	2	2	5	626	3	-	1	1
	市	-	-	6	6	2	1,464	26	490	-	-	2	30	1,954	-		(国)2	-	-	-	-	6	269	9	-	1	2
	計	8	2	9	19	2	1,464	26	490	-	-	2	30	1,954	7		2	-	-	2	2	11	895	12	-	2	3
内 陸 市町村	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	東北横断自 動車道、宮 古秋田横断 道路	1	11	29	-	-	8	232	-	-	-	-
	市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(国)5	-	-	-	-	4	78	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6	11	29	-	-	12	310	-	-	-	-
全体	県	65	16	24	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	3路線	2	17	38	18	21	61	2,827	31	21	3	1
	市町村	-	-	29	29	19	4,911	88	2,090	41	471	10	158	7,472	-		(国)33	-	-	-	-	142	3,006	77	(国)4	3	14
	計	65	16	53	134	19	4,911	88	2,090	41	471	10	158	7,472	32		35	17	38	18	21	203	5,833	108	25	6	15


【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：令和2年11月10日（令和2年11月20日公表）

分野別 整備スケジュール

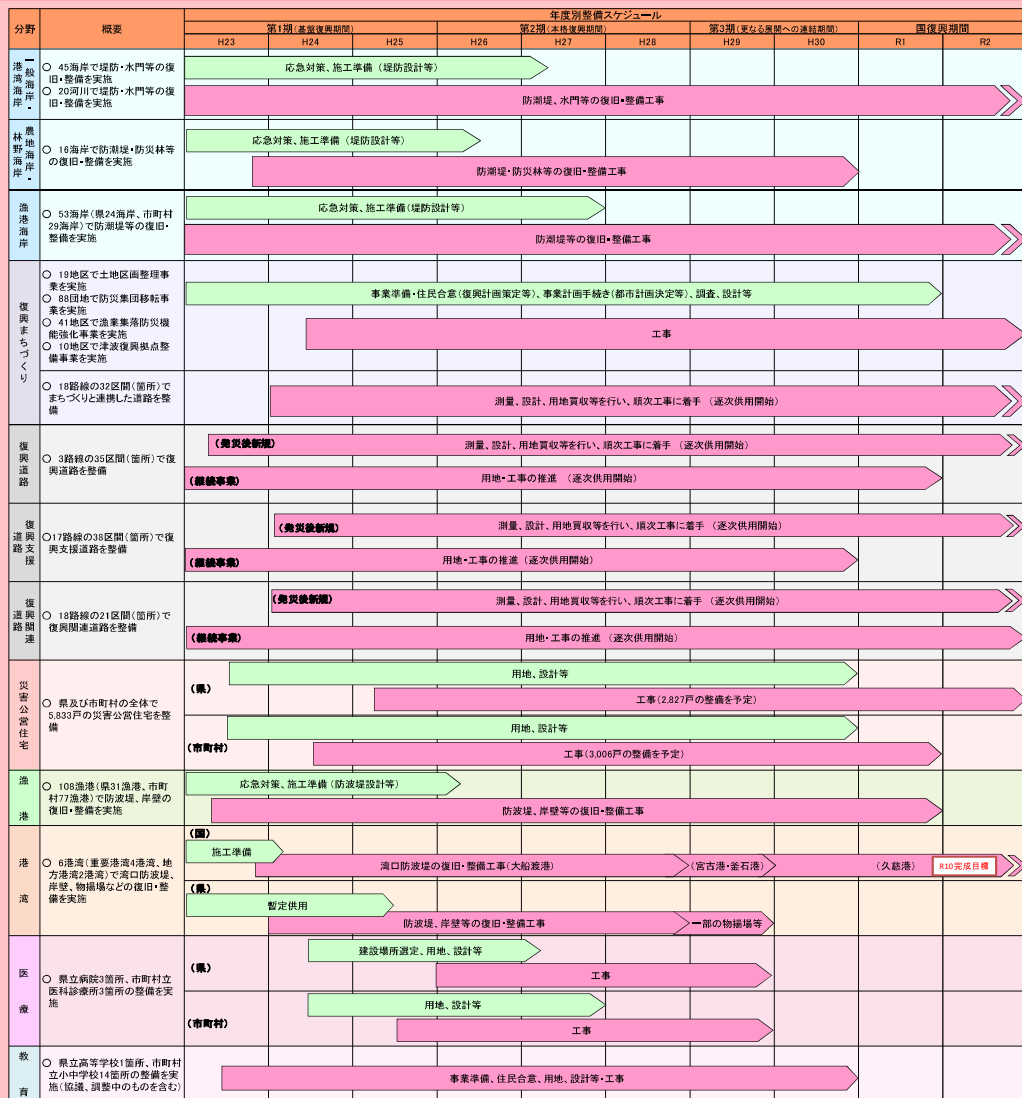

(参考) ロードマップにおける市町村別工程表の見方

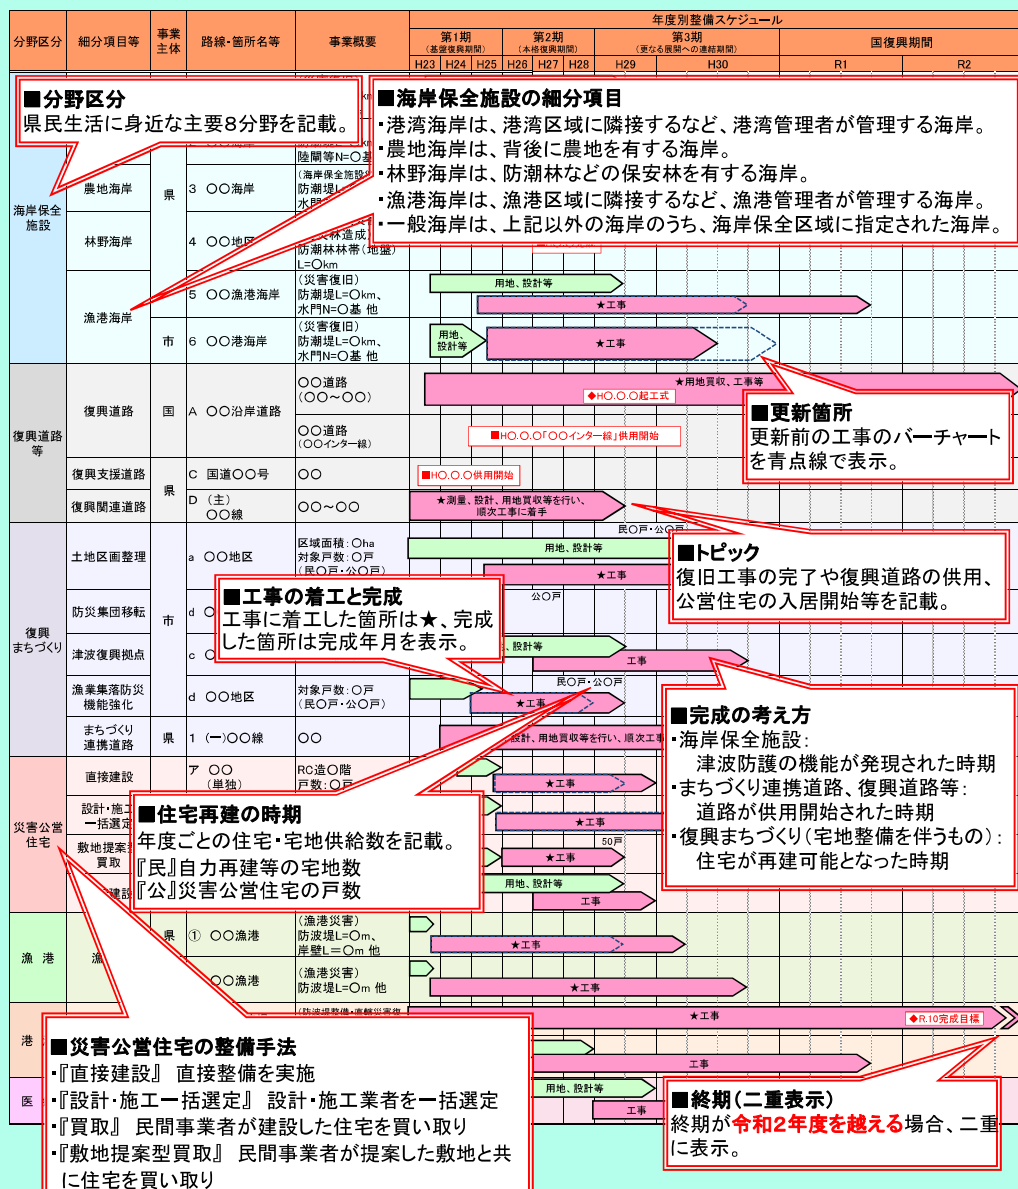

■分野区分

県民生活に身近な主要8分野を記載。

■海岸保全施設の細分項目

- ・港湾海岸は、港湾区域に隣接するなど、港湾管理者が管理する海岸。
- ・農地海岸は、背後に農地を有する海岸。
- ・林野海岸は、防潮林などの保安林を有する海岸。
- ・漁港海岸は、漁港区域に隣接するなど、漁港管理者が管理する海岸。
- ・一般海岸は、上記以外の海岸のうち、海岸保全区域に指定された海岸。

■更新箇所

更新前の工事のバーチャートを青点線で表示。

■工事の着工と完成

工事に着工した箇所は★、完成した箇所は完成年月を表示。

■トピック

復興工事の完了や復興道路の供用、公営住宅の入居開始等を記載。

■完成の考え方

- ・海岸保全施設：津波防護の機能が発現された時期
- ・まちづくり連携道路、復興道路等：道路が供用開始された時期
- ・復興まちづくり(宅地整備を伴うもの)：住宅が再建可能となった時期

■住宅再建の時期

年度ごとの住宅・宅地供給数を記載。
『民』自力再建等の宅地数
『公』災害公営住宅の戸数

■災害公営住宅の整備手法

- ・『直接建設』 直接整備を実施
- ・『設計・施工一括選定』 設計・施工業者を一括選定
- ・『買取』 民間事業者が建設した住宅を買い取り
- ・『敷地提案型買取』 民間事業者が提案した敷地と共に住宅を買い取り


■終期(二重表示)

終期が令和2年度を越える場合、二重に表示。


社会資本の復旧・復興ロードマップ【洋野町 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

海と高原の絆、未来へ 確かな復興

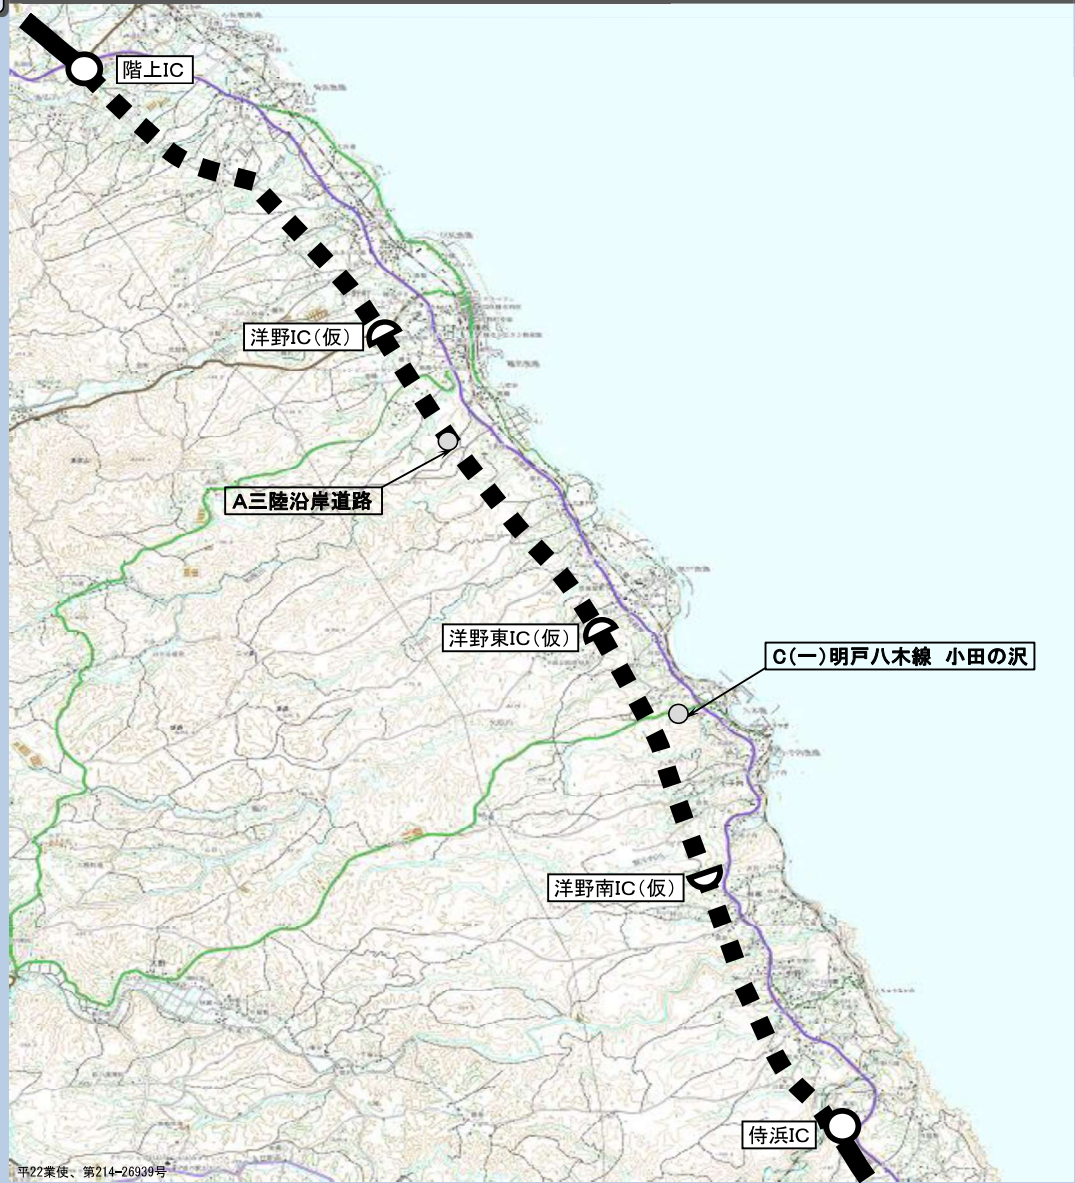

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる度重への連結期間)		国復興期間			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 洋野線上道路 (侍浜～階上)	-	★用地買収、工事等 ※洋野～階上 R2年内 供用予定 ※侍浜～洋野 R2年度末 供用予定									
3.復興道路等	3.復興関連道路	2.県	C (一)明戸八木線 小田の沢	-									◆H31.3着工	★工事

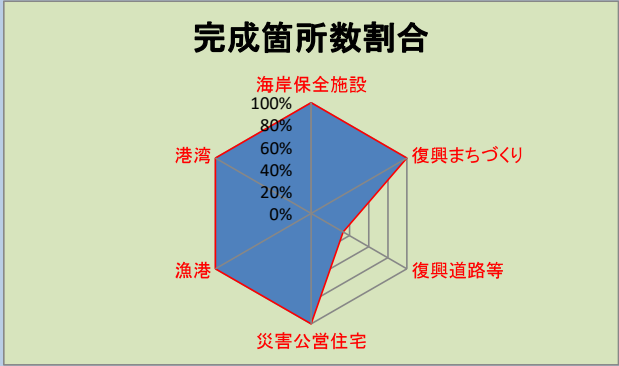

社会資本の復旧・復興ロードマップ【洋野町 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

海と高原の絆、未来へ 確かな復興

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧)根固工V=92m ³ 他	H24.12
			2 平内海岸	(災害復旧)消波工L=220m	H25.10
			3 玉川海岸	(災害復旧)護岸L=87m 他	H24.11
			4 小子内海岸	(災害復旧)監視カメラ1台 他	H24.8
			5 原子内海岸	(災害復旧)根固工V=92m ³ 他	H24.5
			6 八木海岸	(海岸高潮)防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	H29.12
	漁港海岸	県	7 種市漁港海岸	(災害復旧)陸閘N=1基、水門N=4基	H24.3
復興まちづくり	漁業集落防災	町	a 八木	対象戸数:14戸(民14戸)	H30.3
復興道路等	まち連携道路	県	1 (一)八木港線 八木		H29.3
復興道路等	復興関連道路	県	B (一)角ノ浜玉川線 玉川		H28.3
災害公営住宅	直接建設	町	A 八木北(単独)	木造平屋 戸数:4戸	H25.8
漁港	漁港	県	① 種市漁港	(漁港災害)防波堤L=106m 他	H24.9
		町	② 角浜漁港	(漁港災害)防波堤L=10m	H24.3
			③ 川尻漁港	(漁港災害)護岸N=1式 他	H24.3
			④ 鹿糠漁港	(漁港災害)船揚場L=22m 他	H24.3
			⑤ 戸類家漁港	(漁港災害)船揚場N=1式	H24.3
			⑥ 宿戸漁港	(漁港災害)防波堤L=69m、船揚場L=8m 他	H24.12
			⑦ 小子内漁港	(漁港災害)防波堤L=101m、岸壁L=14m 他	H25.1
			⑧ 有家漁港	(漁港災害)防波堤L=85m 他	H25.1
			⑨ 高家漁港	(漁港災害)防波堤L=45m 他	H24.11
港湾	八木港	県	北港地区	(災害復旧)防波堤L=162m、-4.5m岸壁L=159m 他	H26.3
			南港地区	(災害復旧)第2防波堤L=13m、1号護岸L=57.8m	H26.3



八木地区防潮堤(海岸高潮対策事業)




八木地区の宅地嵩上工事(漁業集落防災機能強化事業)

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市 事業中箇所】


基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

新たな視点による 新たなまちづくり

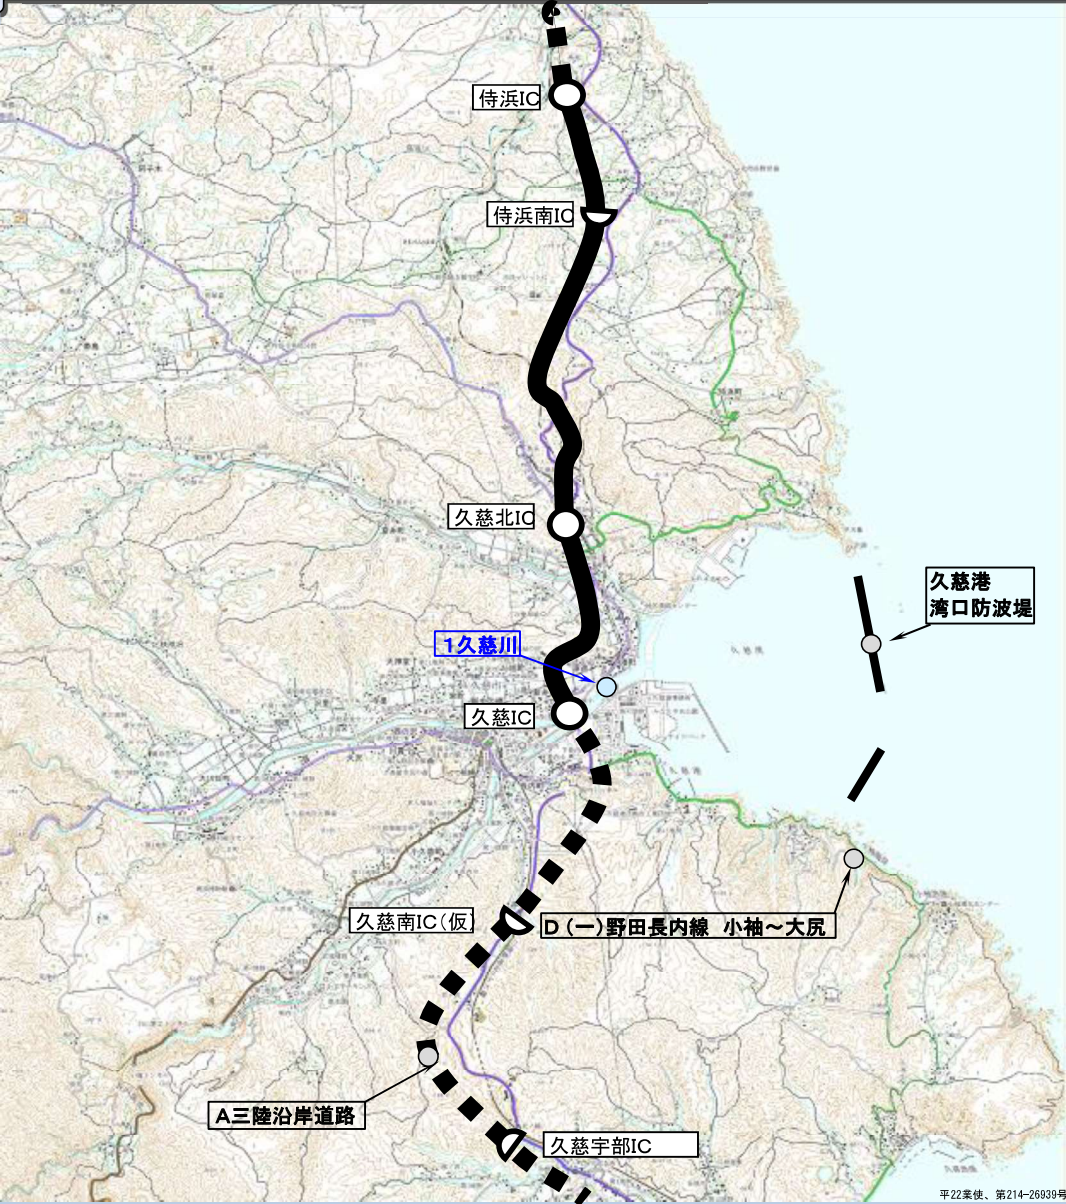

平22案使、第214-26939号

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			国復興期間	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	用地、設計等								★工事	
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 野田久慈道路 (舊代～久慈)	-	★H25.6.27起工事								★用地買収、工事等 ※(仮称)野田IC～久慈 R2年度末供用予定 ※(仮称)野田IC R3年内供用予定	
3.復興道路等	3.関連道路	2.県	D (一) 野田長内線 小袖～大尻	-									★工事	
6.港湾	2.久慈港	1.国	湾口防波堤	(防波堤整備) 防波堤L=3.800m									★工事	R10完成目標

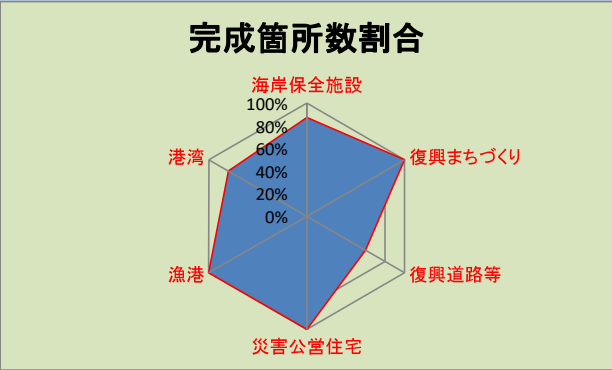

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

新たな視点による 新たなまちづくり

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	2 夏井川	(三陸高潮)防潮堤L=0.8km	R2.3
			3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧)離岸堤L=0.2km	H24.10
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧)防潮堤L=2.6km、陸間N=12基	H28.3
			5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧)離岸堤L=0.4km	H24.10
	漁港海岸	市	6 久喜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.7km	H29.3
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.2km	H29.3
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.3km、水門N=1基	H28.3
			a 久慈湊・大崎	対象戸数：14戸(民9戸・公5戸)	H26.3
復興まちづくり	漁業集落防災	市	b 元木沢	対象戸数：5戸(民2戸・公3戸)	H25.11
			c 玉の脇	対象戸数：3戸(民3戸)	H25.11
			d 久喜	対象戸数：4戸(民1戸・公3戸)	H25.8
					H25.8
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 久慈北道路(久慈北～侍浜)		R2.3
	支援道路	県	B 国道281号 案内		H29.11
	関連道路	県	C (一)侍浜夏井線 本波		H24.9
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎(漁・久慈湊・大崎地区)	木造、戸数：5戸	H26.3
			イ 元木沢(漁・元木沢地区)	木造、戸数：3戸	H26.3
			ウ 久喜(漁・久喜地区)	木造、戸数：3戸	H25.12
漁港	漁港	市	① 久喜漁港	(漁港災害)防波堤L=162m、岸壁L=93m 他	H25.7
			② 桑畑漁港	(漁港災害)用地N=1式 他	H24.1
			③ 田子の木漁港	(漁港災害)護岸N=1式 他	H23.8
			④ 川津内漁港	(漁港災害)防波堤L=11m 他	H24.3
			⑤ 横沼漁港	(漁港災害)-3m岸壁N=1式 他	H24.3
			⑥ 白前漁港	(漁港災害)防波堤L=29m 他	H24.3
			⑦ 麦生漁港	(漁港災害)物揚場N=1式 他	H24.3
			⑧ 久慈湊漁港	(漁港災害)航路N=1式	H23.9
			⑨ 舟渡漁港	(漁港災害)護岸L=64m 他	H24.5
			⑩ 小袖漁港	(漁港災害)防波堤L=150m 他	H24.7
港湾	久慈港	県	堀込地区	(災害復旧)-4.5m岸壁L=180m、-6.0m岸壁L=497m、-2.0m物揚場L=105m	H26.3
			諏訪下地区	(災害復旧)諏訪下防波堤L=5.0m、外防波堤L=293m、-7.5m岸壁L=281.6m、-10.0m岸壁L=23.7m	H26.3
			玉の脇地区	(災害復旧)外防波堤L=297m、北防波堤L=152m、内防波堤L=95m、物揚場L=51m	H25.10
			半崎地区	(災害復旧)半崎防波堤L=23m、波除堤L=40m、-4.0m物揚場L=69m、船揚場L=48m	H25.11



漁港海岸 久慈湊漁港海岸防潮堤




災害公営住宅 久慈湊・大崎地区

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)


安全・安心で活力あるむらづくり

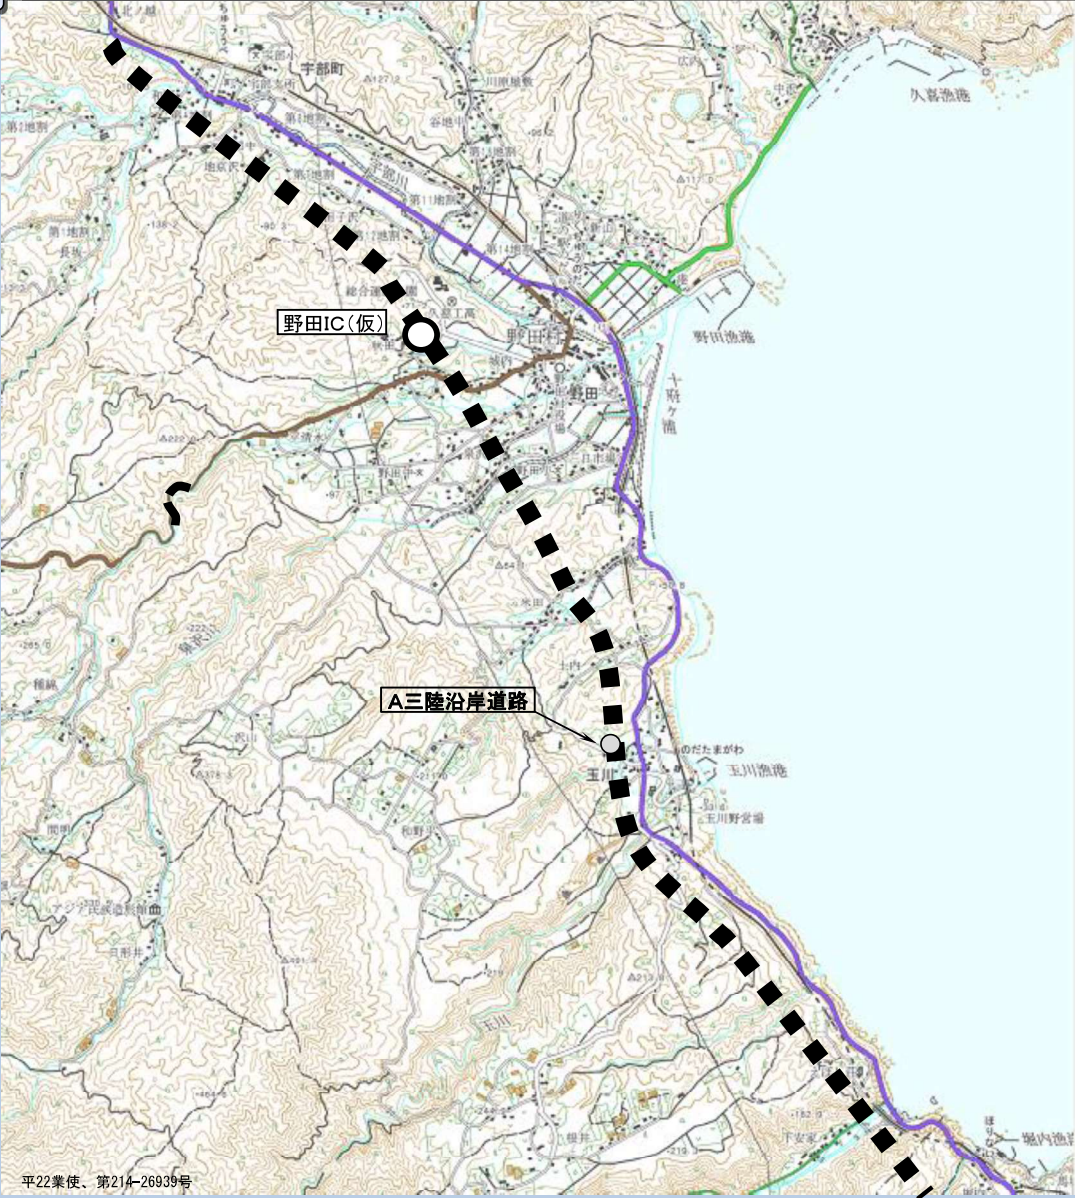

平22業使、第214-26939号

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (事業復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		国復興期間			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 野田久慈道路 (菅代～久慈)	-	★用地買収、工事等 ※(仮称)野田IC～久慈 R2年度末 供用予定 ※菅代～(仮称)野田IC R3年内 供用予定 R3年完成目標									

完成箇所数割合



社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

安全・安心で活力あるむらづくり

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧)水門設備1式他	H26.3
			2 広内海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km、水門等N=4基他	H30.3
			3 野田海岸(明内、泉沢)	(災害復旧)水門設備等1式他	H25.3
			4 米田海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km、水門等N=2基他、(海岸高潮)防潮堤L=0.4km	R2.3
			5 野田玉川海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.05km他	H25.5
			6 野田海岸	(海岸高潮)防潮堤L=0.5km、水門等N=1基	H31.3
	農地海岸	県	7 野田海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤裏法面A=2,320m ² 、水門操作室N=1棟	H24.8
復興まちづくり	林野海岸	県	8 前浜地区	(治山施設災害)防潮堤L=1.3km	H30.3
	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積:12.9ha、対象戸数:137戸(民124戸・公13戸)	H28.10
			b 城内地区	対象戸数:74戸(民20戸・公54戸)	H27.1
	防災集団移転	村	c 米田・南浜地区	対象戸数:24戸(民18戸・公6戸)	H25.11
			d 下安家地区	対象戸数:14戸(民13戸・公1戸)	H26.12
	漁業集落防災	村	e 中沢地区	対象戸数:2戸(民2戸)	H27.3
復興道路等	関連道路	県	1 (主)野田山形線 野田		H30.12
			2 (一)安家玉川線 下安家		H29.3
			B (主)野田山形線 大葛の2		H25.7
災害公営住宅	直接建設	県	B (主)野田山形線 野田		H30.12
			A 野田①(単独)	木造2階 戸数:8戸	H25.3
		村	I 野田②(単独)	木造 戸数:18戸	H26.1
			ウ 城内(区:城内地区)	木造 戸数:13戸	H27.3
			エ 城内(防:城内地区)	木造 戸数:54戸	H28.3
			オ 米田・南浜(防:米田・南浜地区)	木造 戸数:6戸	H26.7
			カ 下安家(漁:下安家地区)	木造 戸数:1戸	H26.7
漁港	漁港	県	① 野田漁港	(漁港災害)防波堤L=125m、岸壁L=307m 他	H26.3
		村	② 玉川漁港	(漁港災害)防波堤L=132m、岸壁L=50m 他	H24.9
			③ 下安家漁港	(漁港災害)防波堤L=28m 他	H24.9



防災集団移転促進事業(城内地区)




漁業集落防災機能強化事業(下安家地区(嵩上げ))


社会資本の復旧・復興ロードマップ【普代村 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ

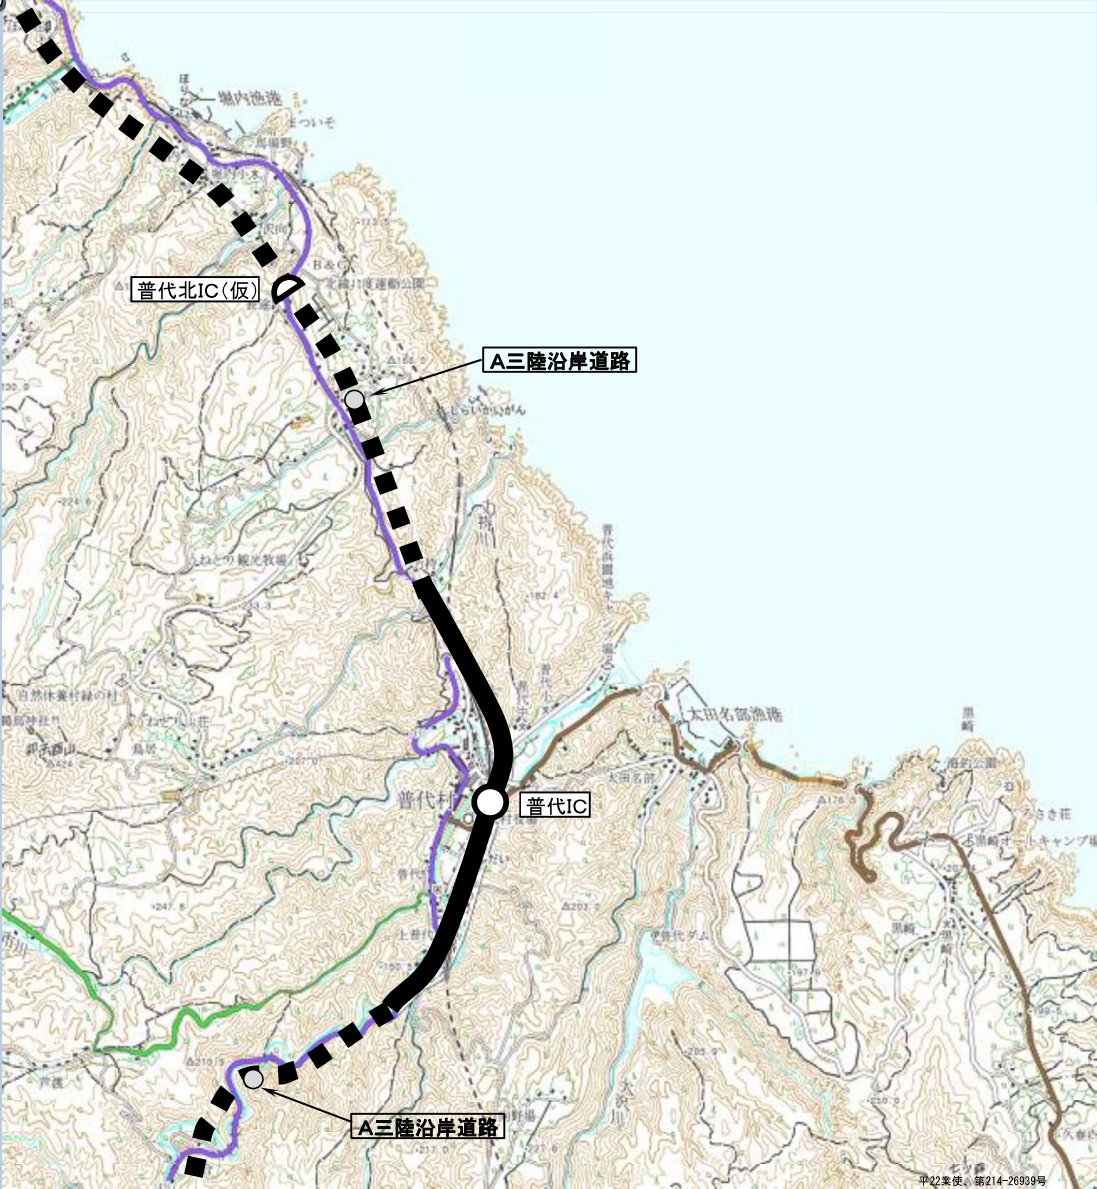

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる復興への進捗期間)		国復興期間		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元		R2
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 野田久慈道路 (普代～久慈)	-	◆H25.6.27起工式 ★用地買収、工事等 (※(仮称)野田IC～久慈 R2年度末 供用予定) ※普代～(仮称)野田IC R3年内 供用予定 R3年完成目標										
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 尾野普代道路 (田野町元～普代)	-	◆H25.11.19起工式 ★用地買収、工事等										

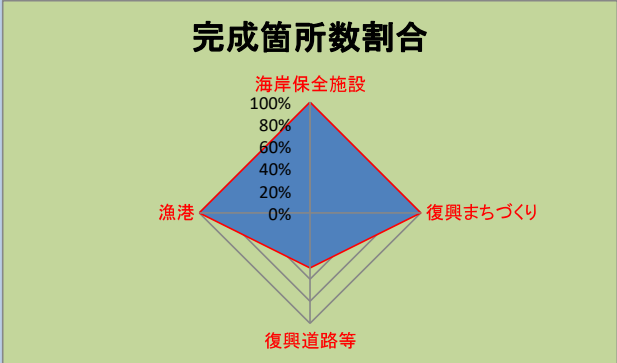

社会資本の復旧・復興ロードマップ【普代村 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)


あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧)水門設備1式 他	H25.10
			2 太田名部海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.1km 他	H24.10
			3 宇留部海岸	(県単治水事業)陸閘N=1基	H25.10
			4 太田名部海岸	(海岸危機)陸閘等遠隔操作化N=2基	H28.3
復興まちづくり	漁業集落防災	村	a 堀内、沢地区	避難路	H27.3
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 普代道路(普代バイパス)		H25.10
	関連道路	県	B (一)普代小屋瀬線 芦渡の2		H29.1
漁港	漁港	県	① 堀内漁港	(漁港災害)防波堤N=1式 他	H25.10
			② 太田名部漁港	(漁港災害)防波堤L=285m、岸壁L=36m 他	H25.10
		村	③ 沢漁港	(漁港災害)防波堤L=77m 他	H25.7
			④ 白井漁港	(漁港災害)防波堤L=89m、岸壁L=7m 他	H24.6
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害)泊地N=1式	H23.9



堀内地区避難路(漁業集落防災機能強化事業)

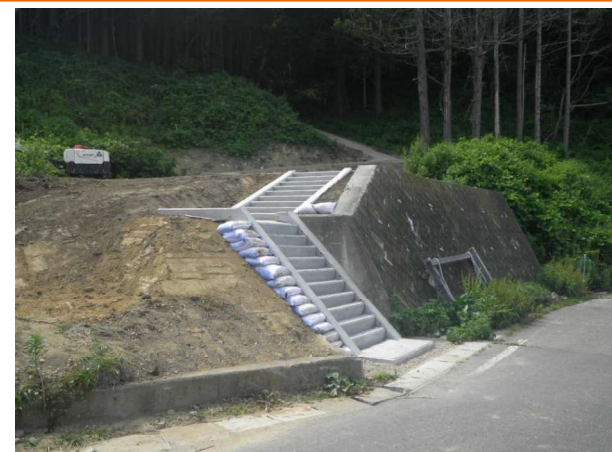


沢地区避難路(漁業集落防災機能強化事業)


社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

心をひとつに 未来に向けた復興

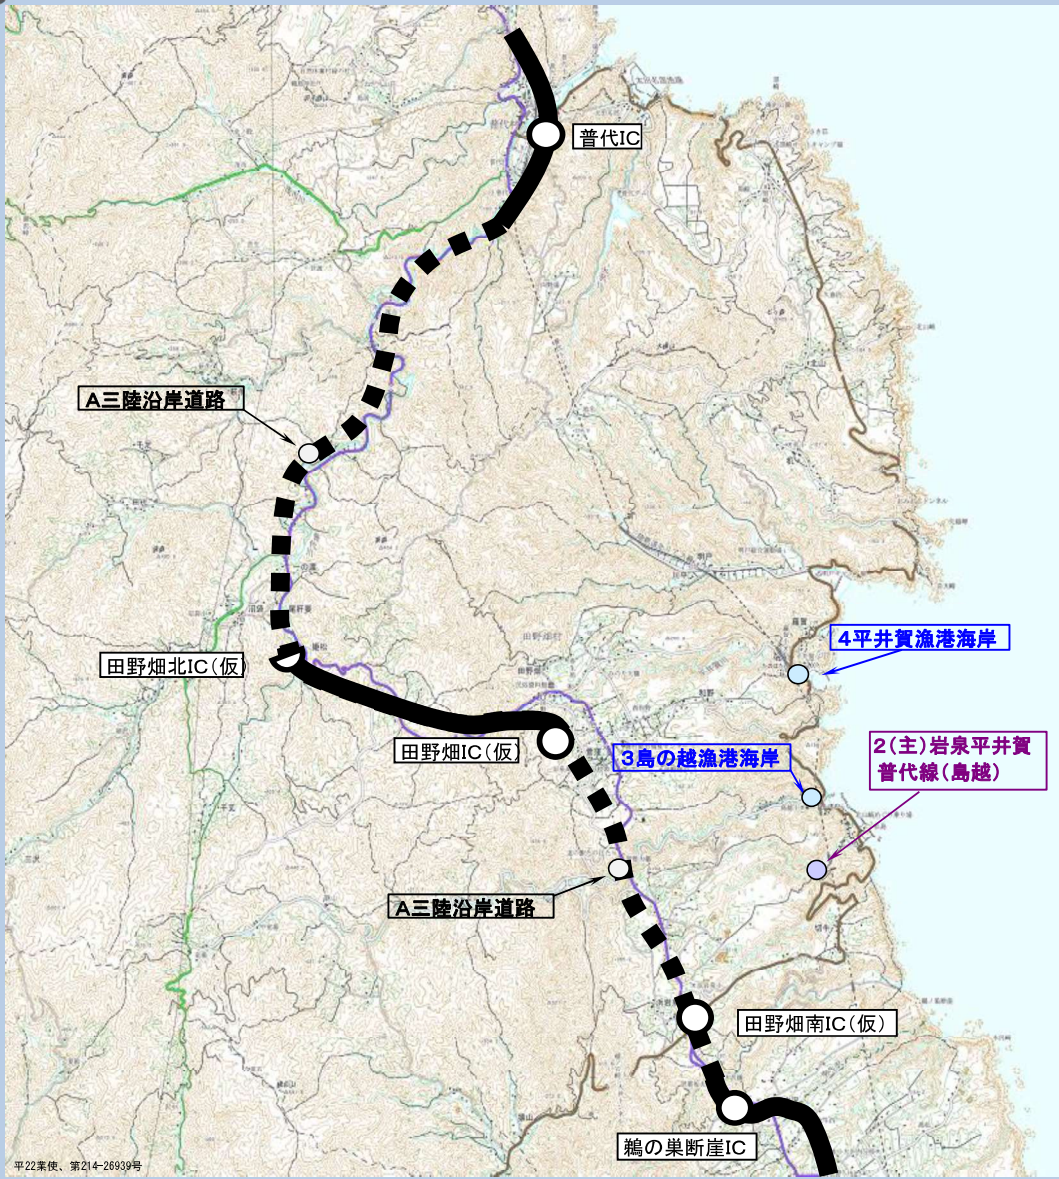

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基礎復興期)		第2期 (本格復興期)			第3期 (更なる展開への連結期)		国復興期間			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	3-1 島の越 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等							★工事		R4.3完成目標	
			3-2 島の越 (松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	用地、設計等							★工事		R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	3.村	4 平井賀 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基	用地、設計等							★工事			
2.復興まちづくり	5.まち連携道路	2.県	2 (主)岩泉 平井賀普代線 島越	-			◆H26.10開工						★工事		
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 尾肝要普代道路 (田野畑北～普代)	-			◆H25.11.18起工式						★用地買収、工事等		
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 田野畑道路 (田野畑南～尾肝要)	-			◆H25.11.7起工式						★用地買収、工事等		

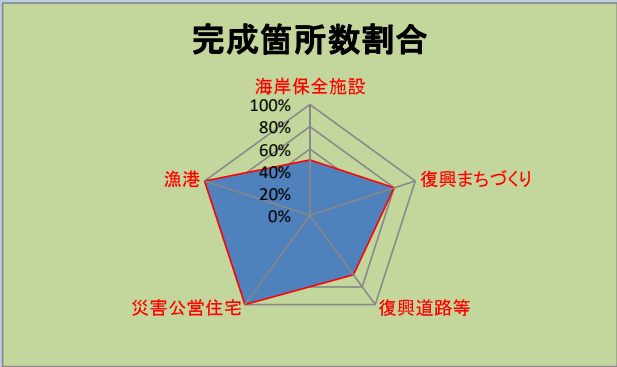

社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

心をひとつに 未来に向けた復興

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機)防潮堤L=0.04km、水門等N=2基	H27. 3
			2 明戸海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	H28. 3
復興まちづくり	漁業集落防災	村	a 羅賀地区	対象戸数:50戸(民23戸・公27戸)	H26. 6
			b 島越地区	対象戸数:72戸(民38戸・公34戸)	H26. 2
復興道路等	まち連携道路	県	1 (主)岩泉 平井賀普代線 明戸		H29. 3
			3 (主)岩泉 平井賀普代線 羅賀		H30. 3
	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 尾肝要道路		H26. 3
			B (一)田野畑岩泉線 室場		H24. 3
			B (一)田野畑岩泉線 室場の2		H30. 3
			B (一)田野畑岩泉線 一の渡		H31. 3
災害公営住宅	買取	村	ア 拓洋台(漁:羅賀地区)	木造 戸数:20戸	H26.11
			イ 羅賀東(漁:羅賀地区)	木造 戸数:7戸	H26. 3
			ウ 黎明台(漁:島越地区)	木造 戸数:24戸	H26. 7
			エ 松前沢(漁:島越地区)	木造 戸数:10戸	H25. 7
	直接建設	村	オ 西和野(単独)	木造 戸数:2戸	H26. 9
漁港	漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害)防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他	H28. 3
			② 北山漁港	(漁港災害)臨港道路L=155m	H25. 3
			③ 机漁港	(漁港災害)防波堤L=125m、岸壁L=101m 他	H30. 1
			④ 平井賀漁港(平井賀地区、羅賀地区)	(漁港災害)防波堤L=666m、岸壁L=193m 他	H26. 8



拓洋台災害公営住宅



平井賀漁港(羅賀地区)

社会資本の復旧・復興ロードマップ【岩泉町 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮)防潮堤L=0.2km	H28. 3
			2 小本海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.3km	H25. 3
	漁港海岸	県	3 茂師漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.1km	H29. 3
		町	4 小本漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H25. 3
復興まちづくり	漁業集落防災	町	a 小本地区	対象戸数:59戸(民59戸)	H27. 3
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 田老岩泉道路(田老北～岩泉龍泉洞)		H30. 3
	支援道路	県	B (主)久慈岩泉線 龍泉洞		H24. 8
			B (主)久慈岩泉線 大月峠		H28.11
災害公営住宅	直接建設	町	ア 森の越(単独)	木造 戸数:15戸	H25. 5
			イ 小本(単独)	木造 戸数:20戸、RC造 戸数:16戸	H26. 3
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害)防波堤L=493m、岸壁L=280m 他	H27. 3
		町	② 小本漁港	(漁港災害)防波堤L=103m、岸壁L=844m 他	H27. 3
港湾	小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧)防波堤L=871m、岸壁L=119m、物揚場L=105m他	H27. 9
医療	医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備	H27.12
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧)移転	H28. 3
	中学校	町	2 小本中学校	(災害復旧)移転	H28. 3



小本小学校・小本中学校(小本小学校及び小本中学校移転復旧事業)




町営住宅小本団地(災害公営住宅整備事業)


社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

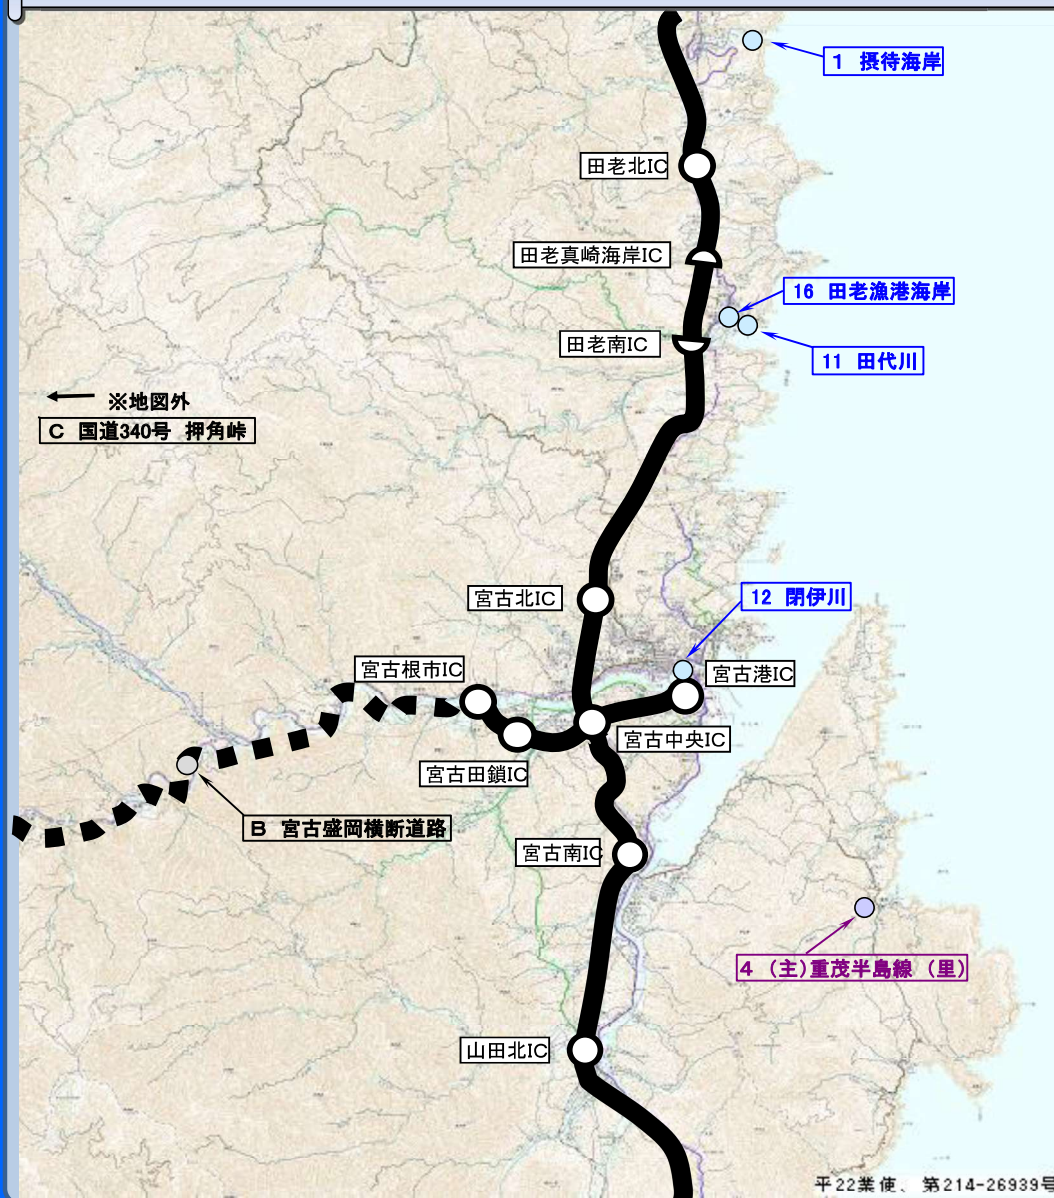

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復旧期間) H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	国復興期間 R元	R2
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	1 振待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	用地、設計等								★工事	R4.3完成目標
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、設計								★工事	
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、設計等								★工事	R9.3完成目標
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	16 田老 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 水門N=1基	用地、設計等								★工事	
2.復興まちづくり	5.まち連携道路	2.県	4 (主)重茂半島線 里	-									★工事	
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	B 宮古復興横断道路 宮古箱石道路 (宮古～箱石)	-									★用地買収、工事等	※宮古市下川井地区 R2.3.30供用開始 宮古港IC～宮古中央IC R2.7.12供用開始 基目～復興、川井～箱石 R2(2020)東供用予定
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	B 宮古復興横断道路 平津戸松草道路 (平津戸～松草)	-									★用地買収、工事等	
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	B 宮古復興横断道路 区界道路 (区界～築川)	-									★用地買収、工事等	
3.復興道路等	2.支援道路	2.県	C 国道340号 押角峠 ※岩泉町の復興支援 道路・国道340号 押角峠と同一箇所	-									★工事	

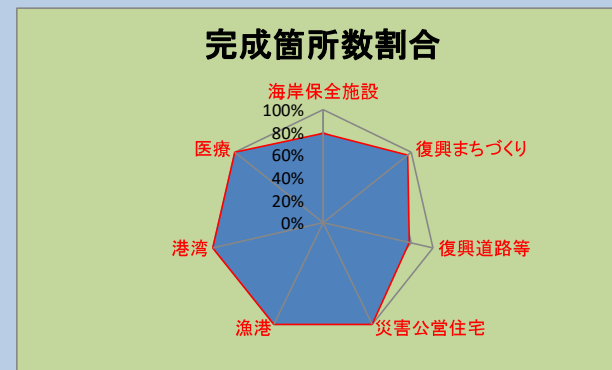

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	2 田老海岸	(災害復旧)防波堤L=1.0km、水門等N=4基 (海岸危機)水門等遠隔操作化N=1基	H29.3
			3 神林海岸	(災害復旧)防波堤L=0.7km、水門等N=7基 (海岸危機)陸側等遠隔操作化N=1基	H29.3
			4 高浜海岸	(災害復旧)防波堤L=1.0km、陸側等N=4基 (海岸危機)防波堤L=0.9km	H29.3
			5 金浜海岸	(災害復旧)防波堤L=1.2km、陸側等N=5基 (海岸危機)防波堤L=1.2km、陸側等N=5基	H29.3
			6 赤前海岸	(災害復旧)防波堤L=0.8km、陸側等N=1基	H30.3
			7 里海岸	(災害復旧)防波堤L=0.3km、陸側等N=1基	H29.12
			8 宮古港海岸(藤原)	(港湾高潮・災害)防波堤L=2.2km、陸側等N=4基	H31.3
			9 宮古港海岸(高浜)	(災害復旧)防波堤L=0.4km、陸側等N=1基	H28.9
			10 宮古港海岸(飯ヶ崎)	(港湾高潮)防波堤L=1.6km	R1.9
			11 津軽石川	(三陸高潮)防波堤L=0.9km	H31.3
農地海岸 林野海岸	農地海岸	県	14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害)防波堤L=0.1km、水門等N=3基	H29.3
			15 振替地区	(高山施設災害)防波堤L=0.3km	H28.7
			17 宿漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.2km	H29.6
			18 津軽石漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.6km、水門等N=1基	H30.3
			19 白浜(宮古)漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.2km	H30.9
漁業集落 防災	漁業集落	市	a 田老地区	区域面積:19.0ha対象戸数:220戸(民180戸・公40戸)	H28.3
			b 飯ヶ崎・光岸地区	区域面積:23.8ha対象戸数:270戸(民230戸・公40戸)	H30.3
			c 田老地区	対象戸数:230戸(民150戸・公80戸)	H27.9
			d 崎山地区(大付)	対象戸数:30戸(民8戸・公22戸)	H28.12
			e 高浜・金浜地区	対象戸数:12戸(民40戸・公12戸)	H28.3
			f 法之郷地区(津軽石)	対象戸数:12戸(民12戸)	H28.3
			g 赤前地区	対象戸数:45戸(民45戸)	H28.3
			h 津軽石地区	区域面積:約1.2ha	H29.2
			i 中心市街地地区	区域面積:約1.8ha	H30.7
			j 根付地区	対象戸数:3戸(民3戸)	H28.7
まち連携 道路	まち連携	市	k 小堀内地区	対象戸数:2戸(民2戸)	H28.3
			l 浦の浜・湯切地区	対象戸数:2戸(民2戸)	H28.3
			m 宮部地区	対象戸数:3戸(民3戸)	H28.7
			n 車道地区	対象戸数:21戸(民17戸・公4戸)	H27.3
			o 千鶴地区	対象戸数:3戸(民3戸)	H28.12
			p 女道戸地区	集落道他	H30.1
			q 石浜地区	対象戸数:2戸(民2戸)	H28.7
			r 田老野原地区	集落道、用地造成	H29.10
			1 (主)重茂半島線 前平～堀内		H31.3
			2 (主)重茂半島線 堀内～津軽石		H31.3



田老三王団地(田老地区防災集団移転促進事業)

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 田老岩泉道路(田老北～岩泉岩泉洞)		H30.3
			A 三陸沿岸道路 宮古田老道路(宮古中央～田老北)		H27.3
			A 三陸沿岸道路 宮古道路(宮古中央～インター)		H25.3
			A 三陸沿岸道路 山田宮古道路(山田～宮古南)		H29.11
			B 宮古盛岡橋断道路 宮古西道路		H31.3
			C 国道340号 小国		H25.11
			C 国道340号 和井内道路		H30.3
			C 国道340号 立丸峠		H30.11
			D (主)重茂半島線 白浜～堀内		H27.3
			E 宮古市道北都環状線 山口		H28.12
災害公営 住宅	直接建設	県	F (一)津軽石停車場線 津軽石		H31.3
			A 本町(単独)	RC造8階 戸数:34戸	H27.9
			I 西町(単独)	RC造4階 戸数:23戸	H27.6
			ウ 津軽石(単独)	RC造5階 戸数:35戸	H27.7
			E 上村(単独)	RC造4階 戸数:24戸	H28.3
			オ 上島(単独)	RC造5階 戸数:42戸	H27.7
			カ 八木沢(単独)	RC造5階 戸数:50戸	H27.2
			キ 佐原(単独)	S造2階 戸数:30戸	H27.3
			ク 崎山(単独)	S造2階 戸数:20戸	H27.3
			コ 鶴崎町(単独)	S造3階 戸数:20戸	H27.9
まち連携 道路	設計・施工 一括選定	県	サ 栗田(単独)	S造3階 戸数:17戸	H27.7
			シ 西町(その2)(単独)	RC造5階 戸数:30戸	H27.6
			セ 田老(高台)(防・田老地区)	木造 戸数:36戸	H27.10
			ソ 田老(区・田老地区)	RC造5階 戸数:40戸	H27.11
			タ 田老(高台Ⅱ)(防・田老地区)	木造 戸数:35戸	H28.3
			チ 崎山(防・崎山地区)	RC造4階 戸数:24戸	H27.3
			テ 日の出町(単独)	木造 戸数:26戸	H27.4
			ト 港町(区・飯ヶ崎地区)	RC造5階 戸数:40戸	H27.12
			ト 黒田町(単独)	RC造5階 戸数:24戸	H27.8
			ナ 和見町(単独)	RC造5階 戸数:23戸	H27.3
まち連携 道路	買収	市	ニ 西ヶ丘(単独)	RC造4階 戸数:24戸	H27.4
			ニ 山口(単独)	RC造4階 戸数:23戸	H29.1
			ホ 高浜(単独)	木造2階 戸数:12戸	H28.4
			ロ 金浜(防・金浜地区)	木造2階 戸数:12戸	H27.11
			ハ 赤前(単独)	木造2階 戸数:14戸	H28.11
			ニ 重茂(重茂地区)	木造 戸数:4戸	H27.6
			ヒ 近内Ⅰ(単独)	RC造5階 戸数:40戸	H28.3
			ヘ 近内Ⅱ(単独)	RC造5階 戸数:40戸	H27.3

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
漁港	漁港	県	① 田老漁港	(漁港災害)防波堤L=689m、岸壁L=1.133m 他	H27.9
			② 宮部漁港	(漁港災害)防波堤L=352m、岸壁L=206m 他	H26.12
			③ 重茂漁港	(漁港災害)防波堤L=373m、岸壁L=663m 他	H26.12
			④ 小堀内漁港	(漁港災害)防波堤L=121m、岸壁L=127m 他	H27.3
			⑤ 青野漁港	(漁港災害)防波堤L=46m 他	H25.10
			⑥ 小港漁港	(漁港災害)防波堤L=139m 他	H28.3
			⑦ 堀内漁港	(漁港災害)防波堤L=72m、岸壁L=52m 他	H25.10
			⑧ 宿漁港	(漁港災害)防波堤L=85m、岸壁L=155m 他	H29.3
			⑨ 日出島漁港	(漁港災害)防波堤L=526m、岸壁L=320m 他	H29.3
			⑩ 蝦の浜漁港	(漁港災害)防波堤L=260m 他	H29.3
港湾	宮古港	市	⑪ 津軽石漁港	(漁港災害)防波堤L=196m、岸壁L=50m 他	H26.12
			⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害)防波堤L=110m、岸壁L=200m 他	H27.3
			⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害)防波堤L=139m、岸壁L=101m 他	H28.9
			⑭ 仲細漁港	(漁港災害)防波堤L=157m、岸壁L=145m 他	H26.12
			⑮ 姉吉漁港	(漁港災害)防波堤L=86m、岸壁L=40m 他	H28.9
			⑯ 千鶴漁港	(漁港災害)防波堤L=428m、岸壁L=260m 他	H28.3
			⑰ 石浜漁港	(漁港災害)防波堤L=345m、岸壁L=100m 他	H26.1
			⑱ 川代漁港	(漁港災害)防波堤L=73m、岸壁L=45m 他	H27.3
			国 竜神防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧)防波堤L=400m 概成	H30.3
			出崎地区	(災害復旧)出崎防波堤(2)L=20m	H28.3
医療	医科 診療所	市	飯ヶ崎地区	(災害復旧)閉伊川 1.5m物揚場L=295m、 3.0m物揚場L=728m	H30.3
			日立浜地区	(災害復旧)L=4.5m岸壁L=240m、2.0m物揚場L=101m、 船揚場(1)L=228m、船揚場(2)L=84m	H29.3
			高浜地区	(災害復旧)防波堤(北)L=250.2m、防波堤(南)L=200m、 2.0m物揚場(1)、(2)L=200m他	H27.3
			藤原地区	(災害復旧)船揚場L=50m、埠頭保安設備L=1.250m	H28.3
			神林地区	(災害復旧)南防波堤L=112m、防波堤L=31m、 2.0m物揚場L=181m 他	H29.3
			浄土ヶ浜地区	(災害復旧)防波堤L=89m、2.0m物揚場L=44m、 さんぽ=70m	H25.7
			診療所	診療所施設整備	H28.8




山口災害公営住宅(災害公営住宅整備事業)


社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

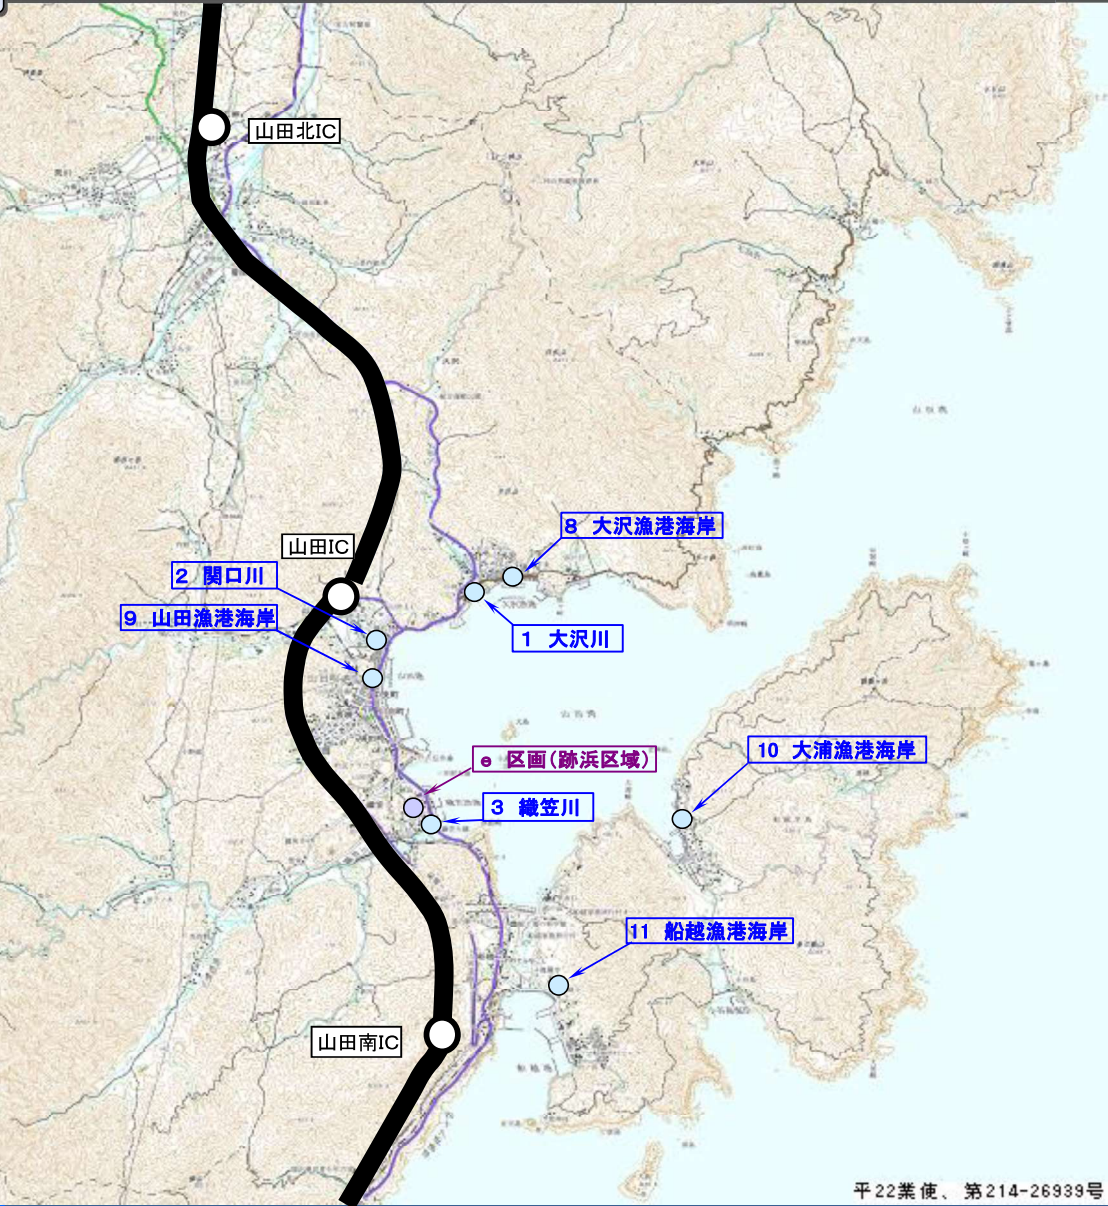

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										国復興期間	
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる復興への過渡期間)		R元			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事								
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事							R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事							R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.4km	用地、設計等			★工事							R4.3完成目標	
			8-2 大沢 (熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km 陸間N=1基	用地、設計等			★工事							R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、 水門N=1基、陸間N=1基	用地、設計等			★工事							R4.3完成目標	
			9-2 山田 (柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.6km	用地、設計等			★工事							R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km	用地、設計等			★工事								
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	11 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km 水門N=6基、陸間N=6基	用地、設計等			★工事							R4.3完成目標	
2.復興まちづくり	1.土地区画整理	3.町	e 織笠地区 (跡浜区域)	区域面積: 2.5ha	★工事											

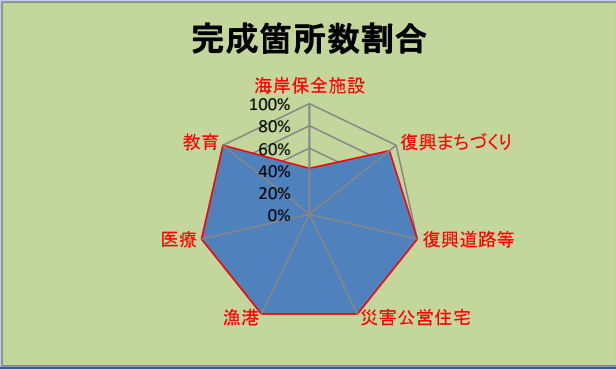

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)


みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	4 船越南海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	H30.3
	農地海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.6km、水門等N=1基	H30.3
	小谷島海岸	県	6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	H29.3
	林野海岸	県	7 浦の浜地区	(治山施設災害)防潮堤L=0.4km	H25.3
	漁港海岸	町	12 織笠漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.4km	R1.11
復興まち づくり	土地区画 整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha、対象戸数: 139戸(民139戸)	H28.10
			b 山田地区	区域面積: 20.3ha、対象戸数: 619戸(民473戸、公146戸)	H31.2
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha、対象戸数: 47戸(民47戸)	H28.5
			d 山田 国道45号周辺地区	区域面積: 19.8ha	R1.9
	防災集団 移転	町	f 山田地区	対象戸数: 129戸(民93戸・公36戸)	H30.12
			g 織笠地区	対象戸数: 170戸(民148戸・公22戸)	H28.5
			h 船越・田の浜地区	対象戸数: 210戸(民144戸・公66戸)	H28.8
			i 小谷島地区	対象戸数: 3戸(民3戸)	H26.9
	津波復興 拠点	町	j 山田地区	(中心市街地エリア)区域面積: 3.1ha (公共防災エリア)区域面積: 3.5ha	H29.3 H30.3
	漁業集落 防災	町	k 大沢地区	対象戸数: 151戸(民136戸・公15戸)	H28.8
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 山田宮古道路(山田～宮古南)		H29.11
	支援道路	県	B 三陸沿岸道路 釜石山田道路		R1.6
	支援道路	県	B (一)宮古山田線 豊間根		H29.11
災害公営 住宅	直接建設	県	A 豊間根(単独)	S造3階、戸数: 72戸	H26.6
			イ 大沢(単独)	RC造5階、戸数: 35戸	H28.3
			ウ 北浜(単独)	RC造4階、戸数: 72戸	H28.10
	設計・施工 一括選定	県	オ 妻の神(単独)	RC造4階、戸数: 52戸	H27.10
	買取	町	カ 飯岡(防: 山田地区)	戸数: 36戸	H30.12
		町	キ 船越第1(防: 船越・田の浜地区)	RC造3階、戸数: 21戸	H29.11
	直接建設 (県建設分)	町	ク 田の浜(防: 船越・田の浜地区)	RC造3階、戸数: 18戸	H29.12
			ケ 長林(防: 船越・田の浜地区)	木造、戸数: 16戸	H29.6
	買取 (県建設分)	町	コ 船越第8(防: 船越・田の浜地区)	木造、戸数: 11戸	H29.6
			サ 下条団地(単独)	木造、戸数: 8戸	H29.3
	買取	町	シ 山田中央(区: 山田地区)	RC造6階、戸数: 146戸	H28.9
			ス 大沢小学校脇(漁: 大沢地区)	木造、戸数: 15戸	H29.3
			セ 織笠跡浜(防: 織笠地区)	S造、戸数: 22戸	H27.1
			ソ 大浦第1(単独)	木造、戸数: 9戸	H28.3
			タ 大浦第2(単独)	木造、戸数: 8戸	H29.3
	改修	町	チ 柳沢(改修)(単独)	RC造、戸数: 49戸	H27.4
	買取	町	テ 長崎第2-1(単独)	RC造、戸数: 42戸	H30.2
			テ 長崎第2-2(単独)	木造、戸数: 8戸	H29.11
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害)防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	H27.3
			② 山田漁港	(漁港災害)防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	H29.3
			③ 大浦漁港	(漁港災害)防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	H28.3
		町	④ 船越漁港	(漁港災害)防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	H29.3
			⑤ 織笠漁港	(漁港災害)防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	H28.3
			⑥ 小谷島漁港	(漁港災害)防波堤L=348m、岸壁L=176m 他	H30.3
医療	病院	県	県立山田病院	病院(RC造)	H28.7
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧)移転	H26.3



織笠漁港海岸防潮堤

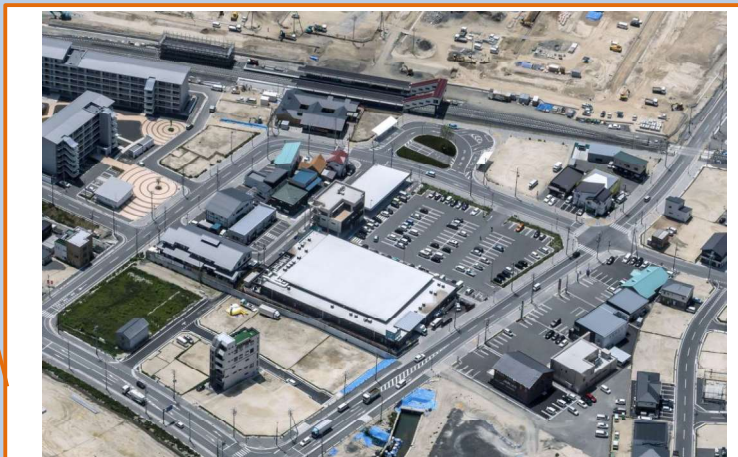


山田地区津波復興拠点整備事業


社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」

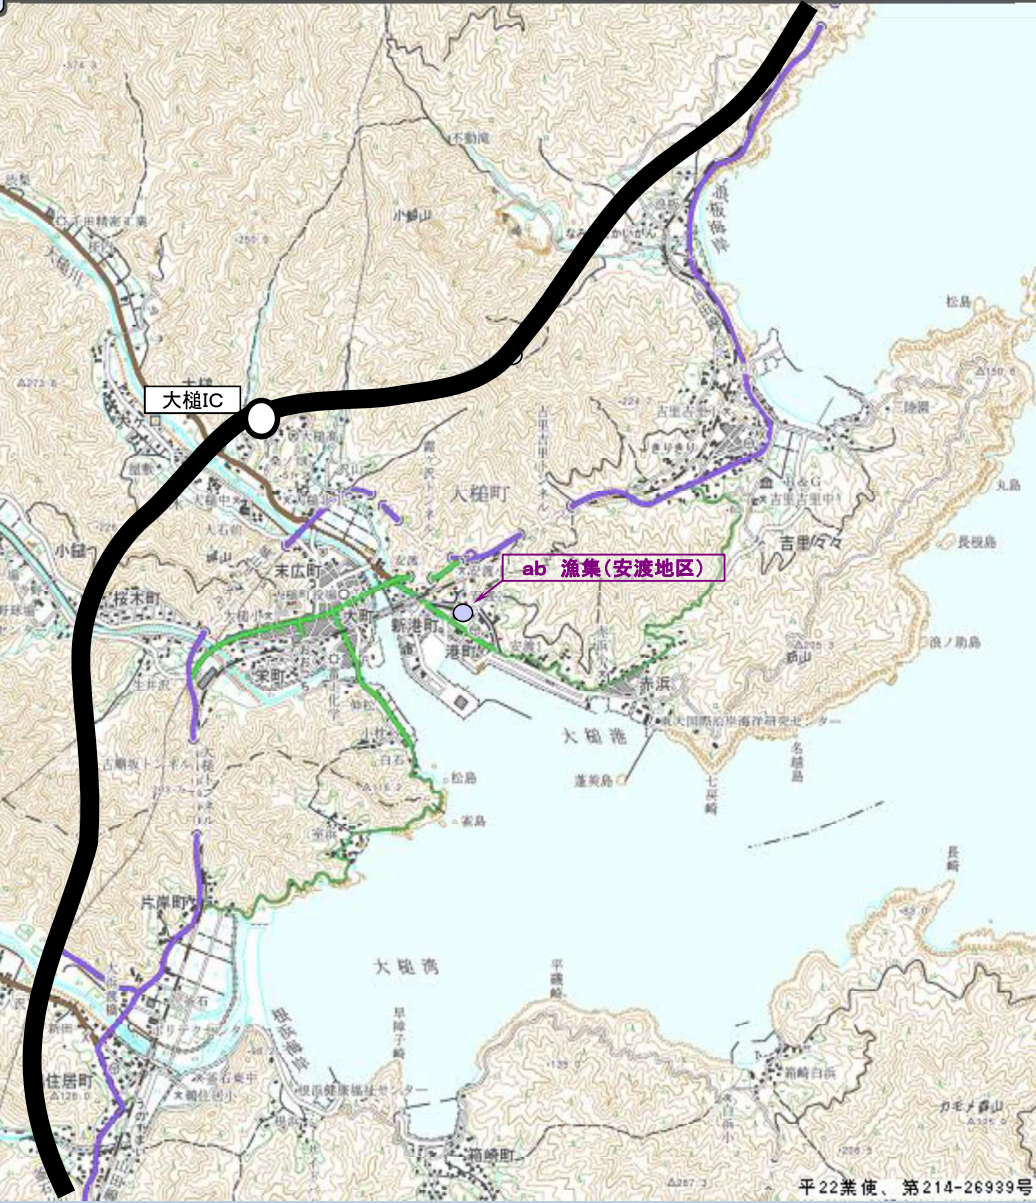

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期			第2期			第3期				国復興期間	
					(基礎復興期間)			(本格復興期間)			(更なる発展への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元		R2	
2.復興まちづくり	4.漁業集落防災	3.町	ab 安渡地区	集落道他	用地、設計等			★工事								

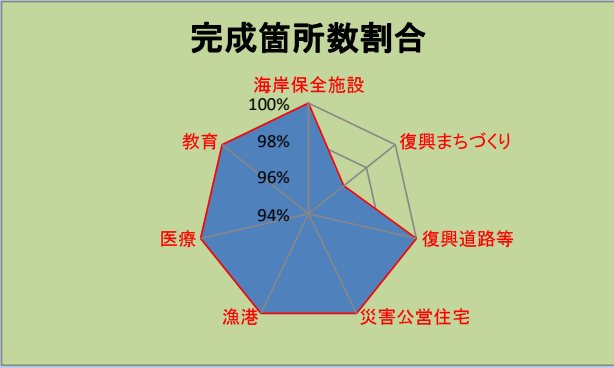

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	1. 大槌川 2. 小槌川	(災害復旧)防波堤L=0.4km、水門等N=1基 (災害復旧)防波堤L=0.2km、水門等N=1基	R2.2 R2.2
	林野海岸	県	3. 浪板地区	(治山施設災害)防波堤L=0.4km	H24.10
	漁港海岸	県	4. 吉里吉里漁港海岸 5. 大槌漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.9km (災害復旧)防波堤L=2.0km	R2.3 R2.3
復興まち づくり	土地区画 整理	町	a. 町方地区 b. 安渡地区 c. 赤浜地区 d. 吉里吉里地区	区域面積:30.0ha、対象戸数:787戸(民510戸・公277戸) 区域面積:5.8ha、対象戸数:169戸(民110戸・公59戸) 区域面積:7.7ha、対象戸数:147戸(民147戸) 区域面積:9.1ha、対象戸数:219戸(民200戸・公19戸)	H29.11 H31.1 H30.3 H29.12
	津波復興 拠点	町	e. 町方地区 f. 安渡地区	区域面積:4.4ha 区域面積:19.9ha	R1.6 R2.3
	防災集団 移転	町	g. 赤浜地区(赤浜①団地)	対象戸数:18戸(民11戸・公7戸)	H31.3
			h. 赤浜地区(赤浜②団地)	対象戸数:34戸(民24戸・公10戸)	H29.2
			i. 赤浜地区(赤浜③団地)	対象戸数:32戸(民13戸・公19戸)	H30.12
			j. 吉里吉里地区(吉里吉里①団地)	対象戸数:18戸(民18戸)	H27.7
			k. 吉里吉里地区(吉里吉里②団地)	対象戸数:35戸(民35戸)	H28.9
			l. 吉里吉里地区(吉里吉里③団地)	対象戸数:13戸(民13戸)	H28.3
			m. 浪板地区(浪板①団地)	対象戸数:11戸(民11戸)	H27.6
			n. 安渡地区	対象戸数:4戸(民4戸)	H31.1
			o. 安渡地区(安渡①団地)	対象戸数:27戸(民27戸)	H29.7
			p. 安渡地区(安渡②団地)	対象戸数:13戸(民13戸)	H28.11
			q. 安渡地区(安渡③団地)	対象戸数:10戸(民10戸)	H29.2
			r. 安渡地区(安渡④団地)	対象戸数:11戸(民11戸)	H30.6
			s. 町方・小枕・仲松地区(寺野日澤団地)	対象戸数:138戸(民100戸・公38戸)	H29.12
			t. 町方・小枕・仲松地区(大ッ口、沢山、夏本、佐内、屋敷前団地)	対象戸数:65戸(民65戸)	H28.11
			u. 町方・小枕・仲松地区(町方団地)	対象戸数:35戸(民35戸)	H29.12
			v. 町方・小枕・仲松地区(小枕団地)	対象戸数:22戸(民22戸)	H28.11
			w. 町方・小枕・仲松地区(花輪団地)	対象戸数:10戸(民10戸)	H27.1
	漁業集落 防災	町	z. 吉里吉里地区	漁業集落排水施設	R2.9
	まち連携 道路	県	aa. 浪板地区 ac. 赤浜地区	対象戸数:21戸(民10戸・公11戸) 対象戸数:2戸(民2戸)	H28.12 H29.7
			1. (一)吉里吉里 釜石線 赤浜		H29.9
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 釜石山田道路		R1.6
	関連道路	県	B (主)大槌小国線 土坂の3		H31.2
漁港	漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害)防波堤L=596m、岸壁L=753m 他	H28.3
			② 大槌漁港	(漁港災害)防波堤L=1486m、岸壁L=2582m 他	H28.3
医療	病院	県	県立大槌病院	病院(RC造)、医師公舎(RC造)、職員公舎(RC造)	H28.3
教育	小学校	町	大槌小学校、安渡小学校、赤浜小学校、大槌北小学校	(災害復旧)移転	H28.9
	中学校	市	大槌中学校	(災害復旧)移転	H28.9

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
災害公営 住宅	直接建設	県	ア 吉里吉里(単独)	RC造5階、戸数:34戸	H25.8
			イ 大槌(埴内)(単独)	木造、戸数:24戸	H28.3
			ウ 大槌(黒敷町)(単独)	RC造5階、戸数:151戸	H27.10
	買収	県	エ 安渡(C)(区:安渡地区)	RC造5階、戸数:23戸	H30.12
			オ ミナミ(単独)	木造、戸数:97戸	H30.3
	直接建設	町	カ 町方1(共同)(区:町方地区)	RC造、戸数:23戸	H30.9
			キ 町方2(戸建)(区:町方地区)	木造、戸数:38戸	H30.3
			ク 町方2(共同)(区:町方地区)	RC造、戸数:23戸	H31.3
			ク 大ケロ(単独)	木造、戸数:70戸	H25.8
			ケ 屋敷前(単独)	木造、戸数:21戸	H25.11
			コ 大ケロ2丁目(単独)	木造2階、戸数:23戸	H26.9
			サ 埴内①(単独)	木造、戸数:13戸	H26.12
			シ 町方(末広町)(区:町方地区)	RC造6階、戸数:53戸	H28.3
			ス 町方(御社地)(区:町方地区)	RC造、戸数:24戸	H29.12
			セ 町方(本町)(区:町方地区)	木造、戸数:8戸	H29.3
			ソ 町方D東-1(区:町方地区)	木造、戸数:4戸	H29.12
			ソ 町方D東-2(区:町方地区)	木造、戸数:5戸	H29.12
			ソ 町方D東-4(区:町方地区)	木造、戸数:12戸	H29.12
			ソ 町方D西-7(区:町方地区)	木造、戸数:3戸	H30.5
			タ 町方E-1(区:町方地区)	木造、戸数:3戸	H30.6
			タ 町方E-2(区:町方地区)	木造、戸数:6戸	H30.9
			タ 町方E-3(区:町方地区)	木造、戸数:11戸	H30.12
			チ 町方(上町)(区:町方地区)	木造、戸数:4戸	H29.3
			ツ 町方D西-6(区:町方地区)	木造、戸数:2戸	H30.3
			ツ 町方D西-8(区:町方地区)	木造、戸数:5戸	H30.5
			テ 町方F-1(区:町方地区)	木造、戸数:15戸	H30.9
			テ 町方F-2(区:町方地区)	木造、戸数:26戸	H30.7
			テ 町方F-3(区:町方地区)	木造、戸数:12戸	H30.12
			ト 吉里吉里(A)(区:吉里吉里地区)	木造、戸数:5戸	H29.4
			ト 吉里吉里(B)(区:吉里吉里地区)	木造、戸数:12戸	H29.7
			ト 吉里吉里(C)(区:吉里吉里地区)	木造、戸数:2戸	H29.10
			ナ 赤浜①団地(防:赤浜地区)	木造、戸数:7戸	R1.11
			ナ 赤浜②団地(防:赤浜地区)	木造、戸数:10戸	H29.5
			ナ 赤浜③団地(防:赤浜地区)	木造、戸数:19戸	H29.12
			ニ 浪板(浪:浪板地区)	木造、戸数:11戸	H29.7
			ニ 浪板①(単独)	木造、戸数:3戸	H28.6
			ヌ 安渡(A①)(区:安渡地区)	木造、戸数:11戸	H29.12
			ヌ 安渡(A②)(区:安渡地区)	木造、戸数:8戸	H30.3
			ヌ 安渡(A③)(区:安渡地区)	木造、戸数:2戸	H30.2
			ヌ 安渡(B①)(区:安渡地区)	木造、戸数:12戸	H29.7
			ヌ 安渡(B②)(区:安渡地区)	木造、戸数:3戸	R1.8
			ネ 寺野1(防:寺野地区)	木造、戸数:16戸	H27.9
			ネ 寺野2(防:寺野地区)	木造、戸数:11戸	H28.7
			ネ 寺野3(防:寺野地区)	木造、戸数:11戸	H30.3



大槌学園




赤浜①団地 災害公営住宅

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市 事業中箇所】


基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

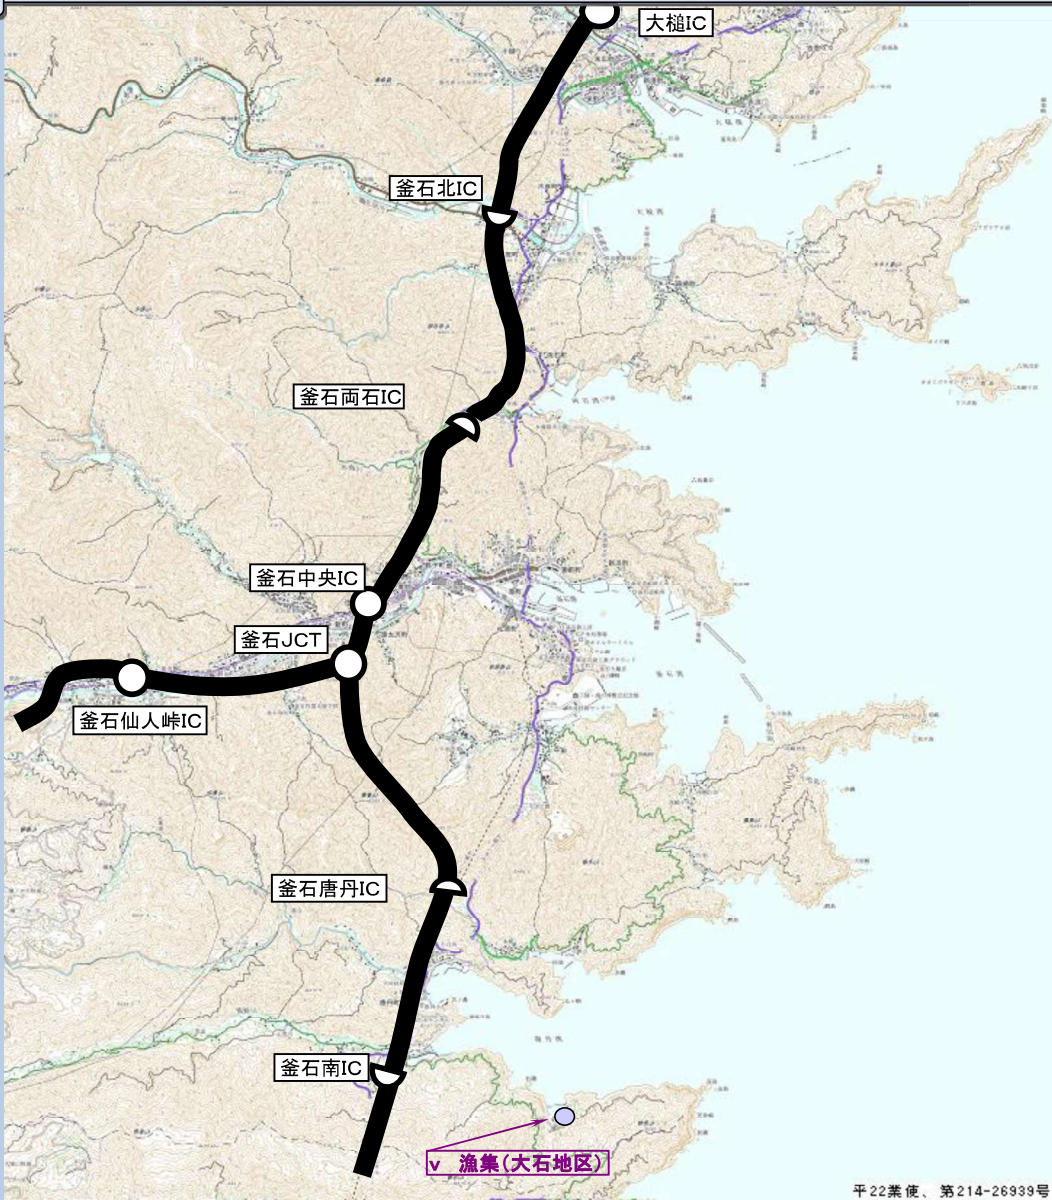

平22業使、第214-26939号

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる復興への連結期間)			復興期間	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
2復興まちづくり	4漁業集落防災	3市	v 大石地区	集落道 他	用地、設計等						★工事			

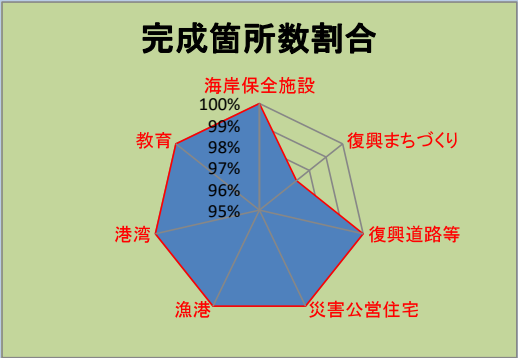

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮)水門N=1基	R1.8
			2 鶴住居川	(災害復旧)水門等N=1基	R1.8
			3 片岸海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.8km、 水門N=1基、離岸堤L=0.3km、 水門N=1基、離岸堤L=0.5km、 水門等N=2基	H30.12
			4 水海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、離岸堤L=0.5km、 水門等N=2基	H28.3
			5 小浜海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基	H30.3
			6 釜石港海岸	(災害復旧)防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基	H30.3
	農地海岸	県	7 本郷海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.3km、 水門等N=3基	H30.11
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.3km、 水門等N=3基	H30.3
	林野海岸	県	9 根浜地区	(治山施設災害復旧)防潮堤L=0.6km	H28.3
			10 箱崎漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.7km	R2.3
	漁港海岸	市	11 白浜(鶴)漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	H30.3
			12 南石漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km	R2.9
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.9km	R2.7
			14 小浜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	R2.3
			15 室浜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.3km	R2.3
			16 仮宿漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H29.8
			17 桑の浜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H31.3
			18 蟠石漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km	R1.9
			19 平田漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km、水門N=1基	R2.6
			20 白浜(釜石)漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H31.3
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.1km	R1.9
復興まち づくり	土地区画 整理	市	a 平田地区	区域面積:22.9ha、 対象戸数:158戸(民158戸)	H29.10
			b 片岸地区	区域面積:22.7ha、 対象戸数:208戸(民190戸・公18戸)	H31.3
			c 鶴住居地区	区域面積:49.2ha、 対象戸数:649戸(民529戸・公120戸)	H31.3
			d 蟠石・松原地区	区域面積:13.0ha、 対象戸数:323戸(民179戸・公144戸)	H29.12
	防災集団 移転	市	e 室浜地区	対象戸数:10戸(民7戸・公3戸)	H27.10
			f 根浜地区	対象戸数:34戸(民25戸・公9戸)	H28.8
			g 箱崎地区	対象戸数:29戸(民18戸・公11戸)	H28.3
			h 箱崎白浜地区	対象戸数:7戸(民7戸)	H28.3
			i 桑ノ浜地区	対象戸数:10戸(民7戸・公3戸)	H28.9
			j 南石地区	対象戸数:3戸(民2戸・公1戸)	H30.3
			k 尾崎白浜地区	対象戸数:8戸(民4戸・公4戸)	H27.9
			l 花露辺地区	対象戸数:17戸(民4戸・公13戸)	H25.12
			m 本郷地区	対象戸数:20戸(民10戸・公10戸)	H27.9
			n 唐丹地区(小浜浜)	対象戸数:15戸(民15戸)	H28.7
			o 荒川地区	対象戸数:9戸(民1戸・公8戸)	H27.9
	漁業集落 防災	市	p 東部地区	区域面積:16.1ha	R2.3
			q 鶴住居地区	区域面積:10.0ha	H31.3
			r 室浜地区	対象戸数:15戸(民11戸・公4戸)	H27.10
			s 仮宿地区	対象戸数2戸(民2戸)	H28.3
			t 桑ノ浜地区	対象戸数:8戸(民3戸・公5戸)	H28.8
			u 花露辺地区	集落道 他	H28.2
			w 新浜町地区	用地造成 他	R2.3
			x 佐須地区	対象戸数:5戸(民5戸)	H27.6
			y 根浜地区	対象戸数:7戸(民6戸・公1戸)	H28.7
			z 箱崎地区	対象戸数:24戸(民14戸・公10戸)	H28.3
			aa 箱崎白浜地区	対象戸数:9戸(民3戸)	H28.3
			ab 南石地区	対象戸数:53戸(民42戸・公11戸)	H30.3
			ac 尾崎白浜地区	対象戸数:1戸(民1戸)	H27.9
			ad 本郷地区	対象戸数4戸(民2戸・公2戸)	H27.9
			ae 唐丹地区	集落排水施設整備L=3.353m、処理施設整備1式	R1.10
まち連携 道路	県		1 (一)吉里吉里釜石線 室浜の2		H29.12
			2 (一)吉浜上荒川線 下荒川の2		H27.11
			3 (一)吉里吉里釜石線 室浜		H30.10
			4 (一)唐丹日頃市線 荒川		H30.8
			5 (国)283号 松原		H28.3

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
復興まち づくり	復興道路 等	国	A 三陸沿岸道路 吉浜釜石道路(吉浜～釜石)		H31.3
			A 三陸沿岸道路 釜石山田道路		R1.6
			B 東北横断自動車道 釜石道路		H31.3
	支援道路	県	C (一)水海道水線 女遊部		H24.3
			D (主)釜石遠野線 剣		H28.8
			E (一)桜井平田線 平田		H28.8
	関連道路	県	F (一)吉浜上荒川線 下荒川		H28.3
			ア 平田(単独)	RC造7階、戸数:126戸	H26.1
			イ 野田(単独)	RC造5階、戸数:32戸	H25.10
	直接建設	県	ウ 日向(単独)	RC造6階、戸数:30戸	H27.7
			エ 片岸(単独)	RC造、戸数:17戸	H29.2
			オ 蟠石第1(区:蟠石・松原地区)	RC造、戸数:52戸	H29.7
			カ 蟠石第2(区:蟠石・松原地区)	RC造、戸数:32戸	H29.7
			キ 松原(区:蟠石・松原地区)	RC造、戸数:60戸	H29.3
			ク 南石(一:南石地区)	RC造、戸数:24戸	H30.4
			ク 上中島1(単独)	S造3階、戸数:54戸	H25.3
			ク 上中島2(単独)	S造8階、戸数:156戸	H27.2
			ケ 花露辺(防:花露辺地区)	RC造4階、戸数:13戸	H25.12
			コ 鶴住居①(区:鶴住居地区)	木造、戸数:14戸	H28.11
			コ 鶴住居②(区:鶴住居地区)	木造、戸数:31戸	H29.9
			コ 鶴住居③(区:鶴住居地区)	S造6階、戸数:32戸	H28.11
			コ 鶴住居④(区:鶴住居地区)	S造6階、戸数:43戸	H29.4
			サ 小浜1号(単独)	S造3階、戸数:27戸	H27.9
	買収	市	シ 小浜2号(単独)	木造、戸数:3戸	H27.7
			シ 片岸(区:片岸地区)	木造、戸数:18戸	H29.8
			ス 東部地区(天神町)(単独)	S造5階、戸数:52戸	H28.5
			ス 東部地区(大町1号)(単独)	S造6階、戸数:44戸	H28.4
			ス 東部地区(大町2号)(単独)	RC造5階、戸数:29戸	H28.10
			ス 東部地区(大町3号)(単独)	RC造8階、戸数:34戸	H28.3
			ス 東部地区(大町4号)(単独)	RC造8階、戸数:41戸	H28.9
			ス 東部地区(大町5号)(単独)	RC造8階、戸数:24戸	H29.3
			ス 東部地区(大町6号)(単独)	RC造8階、戸数:27戸	H28.7
			ス 東部地区(只路1号)(単独)	S造6階、戸数:33戸	H28.7
			ス 東部地区(只路2号)(単独)	S造5階、戸数:11戸	H28.9
			ス 東部地区(只路3号)(単独)	S造6階、戸数:19戸	H28.4
			ス 東部地区(只路4号)(単独)	S造7階、戸数:27戸	H28.7
			ス 東部地区(只路5号)(単独)	S造7階、戸数:22戸	H30.5
			ス 東部地区(大只路1号)(単独)	S造5階、戸数:14戸	H28.6
復興まち づくり	直接建設	市	ス 東部地区(大只路2号)(単独)	S造4階、戸数:22戸	H29.8
			ス 東部地区(浜町)(単独)	RC造5階、戸数:31戸	H30.12
			セ 本郷(防:本郷地区)	木造、戸数:12戸	H28.4
			ソ 箱崎(上前)(一:箱崎地区)	木造、戸数:10戸	H28.10
			ソ 箱崎(野川前・前田)(防:箱崎地区)	木造、戸数:17戸	H28.12
			ソ 箱崎(横瀬)(防:箱崎地区)	木造、戸数:4戸	H28.8
			タ 室浜(防:室浜地区)	木造、戸数:7戸	H28.6
			チ 根浜(防:根浜地区)	木造、戸数:10戸	H29.2
			ツ 桑ノ浜(防:桑ノ浜地区)	木造、戸数:6戸	H29.3
			ト 南石(防:南石地区)	木造、戸数:25戸	H30.10
			ト 荒川(防:荒川地区)	木造、戸数:8戸	H28.4
			ナ 尾崎白浜(防:尾崎白浜地区)(単独)	木造、戸数:5戸	H27.3
			ニ 箱崎白浜(単独)	木造、戸数:9戸	H26.3
			ニ 大石(単独)	木造、戸数:3戸	H25.12
			ネ 唐丹片岸(単独)	木造、戸数:4戸	H27.3

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
漁港	漁港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害)防波堤L=624m、岸壁L=889m 他	H27.3
			② 白浜(鶴)漁港	(漁港災害)防波堤L=505m、岸壁L=504m 他	H27.1
			③ 南石漁港	(漁港災害)防波堤L=596m、岸壁L=834m 他	H28.3
			④ 釜石漁港	(漁港災害)防波堤L=1,120m、岸壁L=1,898m 他	H29.3
			⑤ 唐丹漁港	(漁港災害)防波堤L=623m、岸壁L=572m 他	H27.3
			⑥ 小浜漁港	(漁港災害)防波堤L=819m、岸壁L=834m 他	H26.12
			⑦ 室浜漁港	(漁港災害)防波堤L=163m、岸壁L=190m 他	H28.3
			⑧ 片岸漁港	(漁港災害)防波堤L=72m、岸壁L=135m 他	H27.3
			⑨ 仮宿漁港	(漁港災害)防波堤L=130m、岸壁L=60m 他	H27.3
			⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害)防波堤L=209m、岸壁L=250m 他	H27.3
			⑪ 蟠石漁港	(漁港災害)防波堤L=76m、岸壁L=304m 他	H29.3
			⑫ 平田漁港	(漁港災害)防波堤L=215m、岸壁L=598m 他	H27.3
			⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害)防波堤L=449m、岸壁L=378m 他	H27.10
			⑭ 佐須漁港	(漁港災害)防波堤L=174m、岸壁L=103m 他	H28.3
			⑮ 大石漁港	(漁港災害)防波堤L=361m、岸壁L=233m 他	H27.12
港湾	釜石港	県	A 湾口防波堤	(直轄災害復旧)防波堤L=1,660m	H30.3
			B 須賀地区	(災害復旧)南防波堤L=266m、-4.0m1号物揚場、 L=200m、7.5m岸壁L=152m他	H28.3
教育	小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧)移転	H29.2
			2 鶴住居小学校	(災害復旧)移転	H29.3
	中学校	市	3 唐丹中学校	(災害復旧)現敷地で新築	H29.2
			4 釜石東中学校	(災害復旧)移転	H29.3



室浜漁港海岸 防潮堤




東部地区津波復興拠点

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 事業中箇所】


基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

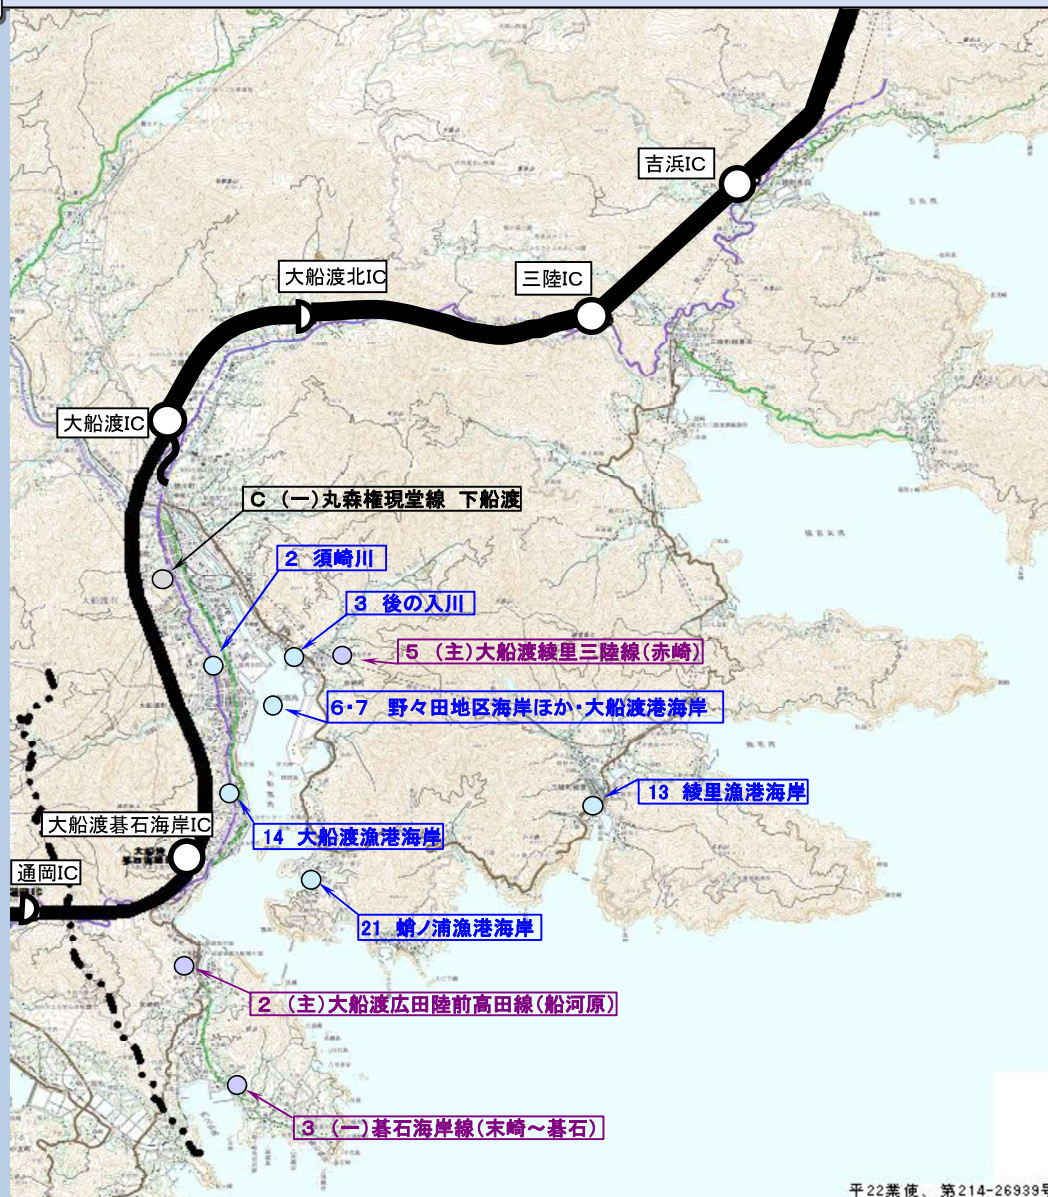

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (延暦復興期間) H23 H24 H25	第2期 (本地復興期間) H26 H27 H28	第3期 (更なる発展への進捗期間) H29 H30	国復興期間						
								R元	R2					
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等					★工事				
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等					★工事				
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	6 野々田地区海岸ほか	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	用地、設計等					★工事			R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	1.一般海岸	2.県	7 大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、水門等N=38基	用地、設計等					★工事			R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	13-1 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、水門N=1基	用地、設計等					★工事			R4.3完成目標	
			13-2 綾里(石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.3km	用地、設計等					★工事			R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	14-2 大船渡(細清地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=1.7km、水門N=1基	用地、設計等					★工事			R4.3完成目標	
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	3.市	21 蛸ノ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km	用地、設計等					★工事				
2.復興まちづくり	5.まち連携道路	2.県	2 (主)大船渡広田陸前高田線(船河原)	-						◆H29.3完工	★工事		R3.12完成目標	
2.復興まちづくり	5.まち連携道路	2.県	3 (主)磯石海岸線(末崎～磯石)	-						◆H29.3完工	★工事		R3.12完成目標	
2.復興まちづくり	5.まち連携道路	2.県	5 (主)大船渡綾里三陸線(赤崎)	-						◆H28.8完工	★工事		R4.3完成目標	
3.復興道路等	3.関連道路	2.県	C (主)丸森権現堂線下船渡	-						◆H29.3完工	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		R4.3完成目標	

完成箇所数割合

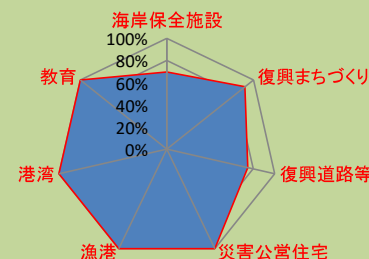

平22業使、第214-26939号

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧)防潮堤L=2.3km	H31.3
			4 越喜来海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.9km、水門N=2基他	H30.3
			5 下田海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km、水門N=2基他	H30.3
			9 大船渡海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.2km	H25.6
			9 宮崎海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.8km、水門等N=2基	H28.3
	農地海岸	県	10 合見海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.2km、水門等N=2基	H28.3
			11 崎浜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km	R2.3
			12 越喜来海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.3km	R1.6
			14-1 大船渡漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.2km	R2.3
			15 門の浜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.6km	R1.8
			16 荒浜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.1km	H28.11
			17 泊漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.3km	H29.3
			18 鬼浜漁港海岸	(災害復旧)海岸護岸L=0.1km	H28.12
			19 小石浜漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H29.3
			20 野野前漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	H30.12
			22 葛石漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H28.7
			23 泊里漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	R2.1
	土地区画整理	市	a 大船渡駅周辺地区	区画面積：約33.8ha、対象戸数281戸(民231戸・公50戸)	H31.3
			b 大船渡地区	対象戸数：18戸(民18戸)	H27.5
			c 峰岸地区	対象戸数：21戸(民21戸)	H27.6
			d 小川原地区(平林)	対象戸数：29戸(民29戸)	H27.6
			e 小川原地区(上山)	対象戸数：6戸(民6戸)	H27.4
			f 小川原地区(鶴巻)	対象戸数：6戸(民6戸)	H26.10
			g 神坂地区	対象戸数：9戸(民9戸)	H27.3
			h 細浦地区	対象戸数：13戸(民13戸)	H27.1
			i 小細浦地区	対象戸数：8戸(民8戸)	H25.12
			j 梅津地区	対象戸数：13戸(民13戸)	H27.4
			k 門之浜地区	対象戸数：13戸(民13戸)	H26.3
			l 泊里地区	対象戸数：19戸(民19戸)	H27.7
			m 佐野地区	対象戸数：5戸(民5戸)	H26.4
			n 中赤崎地区	対象戸数：59戸(民59戸)	H29.9
			o 永浜地区	対象戸数：28戸(民28戸)	H28.11
			p 清水地区	対象戸数：6戸(民6戸)	H26.8
			q 崎ノ浦地区	対象戸数：16戸(民16戸)	H27.10
復興まちづくり	防災集団移転	市	r 田尻地区	対象戸数：12戸(民12戸)	H26.5
			s 港ノ崎地区	対象戸数：23戸(民23戸)	H26.6
			t 泊地区	対象戸数：13戸(民13戸)	H26.1
			u 浦浜南地区	対象戸数：11戸(民11戸)	H26.12
			v 浦浜北・西地区	対象戸数：10戸(民10戸)	H26.12
			w 浦浜東・東置地区	対象戸数：9戸(民9戸)	H27.3
			x 崎浜地区	対象戸数：21戸(民21戸)	H27.6
			y 大船渡地区	区域面積：約2.2ha(先行整備区域)	H30.3
			z 越喜来地区	区域面積：約5.2ha(第2段階整備区域)	H30.3
			1 越喜来地区	対象戸数：30戸(民30戸)	H29.9
			1 (一)崎浜漁港 越喜来		H29.7
			4 (主)大船渡 越喜来		H29.7

細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
復興道路	国	A 三陸沿岸道路 吉浜道路		H27.11
		A 三陸沿岸道路 吉浜金石道路(吉浜～釜石)		H31.3
関連道路	県	B (主)大船渡 越喜来三陸線 小石浜		H29.3
		ア 下谷(単独)	RC造3階、戸数：33戸	H27.1
直接建設	県	イ 上平(単独)	RC造7階、戸数：65戸	H27.6
		ウ 関谷(単独)	RC造5階、戸数：50戸	H28.4
		エ 長谷(単独)	RC造3階、戸数：53戸	H27.3
		オ みどり町(1+2工区)(単独)	RC造6階、戸数：97戸	H27.11
		カ みどり町(3工区)(単独)	RC造6階、戸数：50戸	H28.3
		キ 平林(単独)	RC造4階、戸数：55戸	H28.3
		ク 越喜来(単独)	RC造3階、戸数：30戸	H27.2
		ク 沢田(単独)	RC造3階、戸数：20戸	H27.12
		コ 下館下(単独)	RC造7階、戸数：58戸	H28.9
		サ 田中東団地①(単独)	木造2階、戸数：12戸	H25.3
直接建設	市	シ 田中東団地②(単独)	木造2階、戸数：7戸	H26.3
		ス 泊里団地(単独)	木造平屋、戸数：6戸	H28.3
買収	市	セ 崎浜団地(単独)	木造平屋、戸数：8戸	H28.3
		ソ 浦浜移下団地(単独)	木造平屋、戸数：9戸	H29.3
		タ 中赤崎 移入団地(単独)	木造平屋、戸数：4戸	H29.3
		チ 盛川(単独)	RC造5階、戸数：44戸	H24.12
		ツ 上山団地(単独)	RC造3階、戸数：11戸	H26.4
		テ 赤浜団地(単独)	RC造5階、戸数：23戸	H26.6
		ト 平林団地(単独)	RC造3階、戸数：11戸	H26.4
		ナ 宇津野沢団地(単独)	RC造3階、戸数：20戸	H26.5
		ニ 崎ノ浦団地(単独)	RC造3階、戸数：14戸	H27.5
		ヌ 浦浜所通団地(単独)	RC造3階、戸数：20戸	H27.11
		ネ 中赤崎 山口団地(単独)	RC造3階、戸数：13戸	H28.4
		ノ 中赤崎 大洞団地(単独)	木造、戸数：9戸	H28.3
		ハ 川原(単独)	RC造3階、戸数：28戸	H27.5
		ヒ 区画整理団地		H28.7
		ヘ 大船渡駅周辺地区	RC造5階、戸数：50戸	H28.7

分野 区分	細分項目 等	事業 主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時	
漁港	漁港	県	① 根白漁港	(漁港災害)防波堤L=748m、岸壁L=638m 他	H28.3	
			② 崎浜漁港	(漁港災害)防波堤L=721m、岸壁L=827m 他	H28.3	
			③ 越喜来漁港	(漁港災害)防波堤L=580m、岸壁L=436m 他	H28.3	
			④ 越喜来漁港	(漁港災害)防波堤L=402m、岸壁L=1102m 他	H28.3	
			⑤ 大船渡漁港	(漁港災害)防波堤L=1263m、岸壁L=3512m 他	H29.3	
			⑥ 門の浜漁港	(漁港災害)防波堤L=907m、岸壁L=575m 他	H28.3	
			市	⑦ 千歳漁港	(漁港災害)防波堤L=212m、岸壁L=108m 他	R1.8
			⑧ 鹿沼漁港	(漁港災害)防波堤L=125m、岸壁L=23m 他	H26.3	
			⑨ 吉浜漁港	(漁港災害)防波堤L=223m、岸壁L=185m 他	H28.5	
			⑩ 境前漁港	(漁港災害)防波堤L=137m、岸壁L=15m 他	H29.8	
		市	⑪ 小島漁港	(漁港災害)岸壁L=44m 他	H27.3	
			⑫ 泊漁港	(漁港災害)防波堤L=283m、岸壁L=202m 他	H28.3	
			⑬ 東浜漁港	(漁港災害)防波堤L=329m、岸壁L=209m 他	H26.12	
			⑭ 小石浜漁港	(漁港災害)防波堤L=422m、岸壁L=239m 他	H28.3	
			⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害)防波堤L=176m、岸壁L=247m 他	H28.6	
			⑯ 野野前漁港	(漁港災害)防波堤L=781m、岸壁L=484m 他	H30.1	
			⑰ 小路漁港	(漁港災害)防波堤L=162m、岸壁L=65m 他	H27.9	
			⑱ 合民漁港	(漁港災害)防波堤L=81m、岸壁L=45m 他	H27.10	
			⑲ 長崎漁港	(漁港災害)防波堤L=482m、岸壁L=475m 他	H29.3	
			⑳ 崎ノ浦漁港	(漁港災害)防波堤L=239m、岸壁L=972m 他	H29.3	
			㉑ 葛石漁港	(漁港災害)防波堤L=123m、岸壁L=104m 他	H27.3	
			㉒ 泊里漁港	(漁港災害)防波堤L=211m、岸壁L=248m 他	H28.3	
港湾	大船渡港	国	1 港口防波堤	(直轄災害復旧)防波堤L=535m	H29.3	
			2 野々田地区	(災害復旧)防波堤L=170m、須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、-3.0m物揚場L=70m 他	H28.3	
			3 茶屋前地区	(災害復旧)-9.0m岸壁L=428m、-4.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、-4.0m物揚場L=197m 他	H28.3	
			4 山口地区	(災害復旧)防波堤L=64m、さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m 他	H29.3	
			5 永浜地区	(災害復旧)防波堤L=192m、-2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場L=138m 他	H29.3	
			6 清水地区	(災害復旧)防波堤L=109m、物揚場L=285m、 船揚場L=98m 他	H29.3	
			7 赤土倉地区	(災害復旧)南防波堤L=79m、北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場L=104m 他	H28.3	
		教育	小学校	1 赤崎小学校	(災害復旧)移転	H29.3
				2 越喜来小学校	(災害復旧)移転	H28.10
				3 赤崎中学校	(災害復旧)移転	H29.3



泊里漁港海岸 防潮堤




防災観光交流センター(津波復興拠点整備事業)


社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

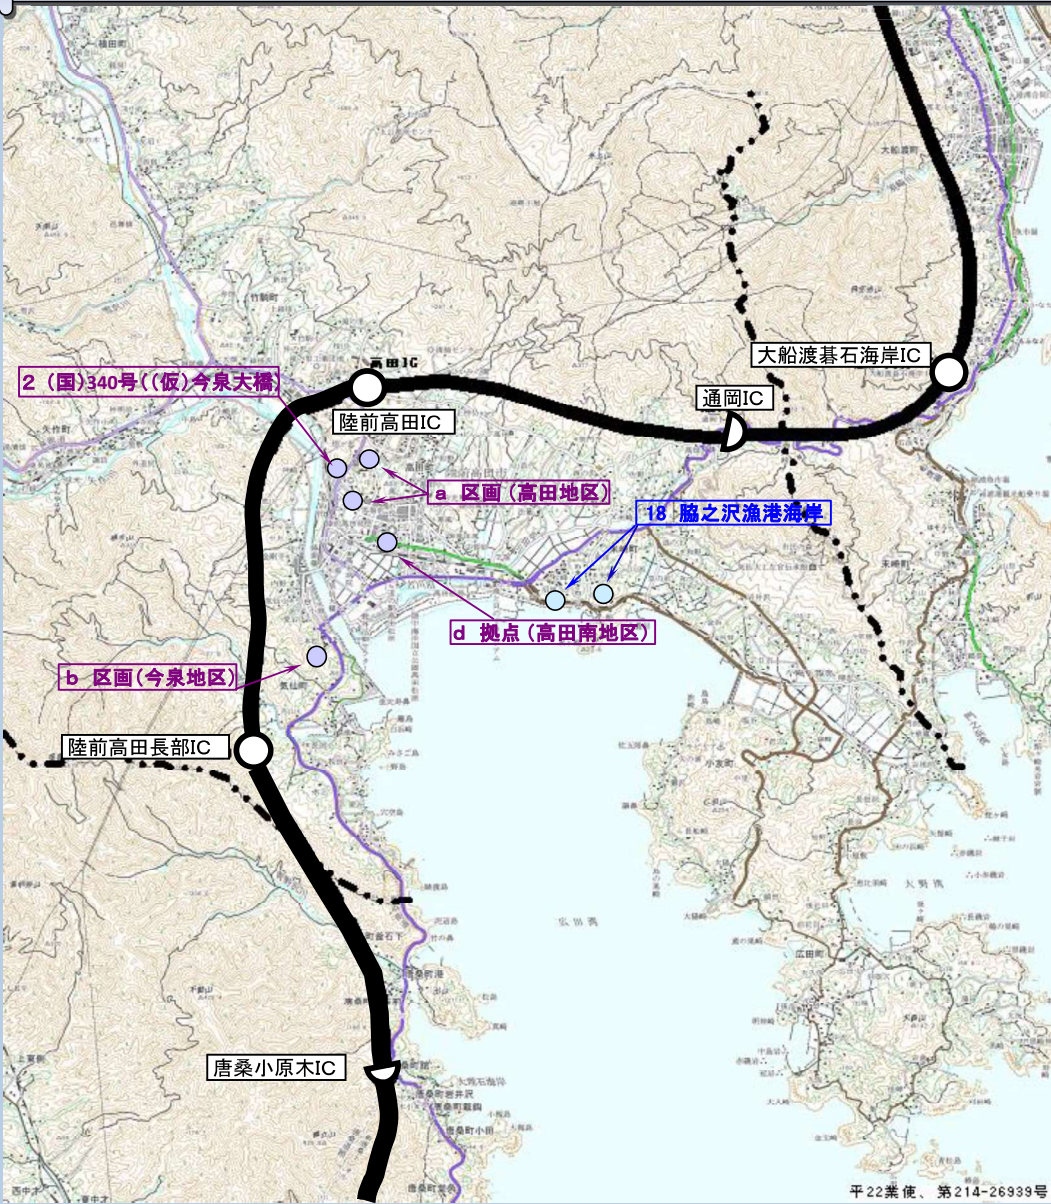

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興計画)	第2期 (本格復興計画)	第3期 (更なる復興への進捗計画)				国復興期間			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	3.市	18 脇之沢 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km	用地、設計等								★工事	
2.復興まちづくり	1.土地区画整理	3.市	a 高田地区	区域面積:198.1ha 対象戸数1,106戸 (民986戸・公120戸)	用地、設計等								★工事	
2.復興まちづくり	1.土地区画整理	3.市	b 今泉地区	区域面積:112.4ha 対象戸数552戸 (民478戸・公74戸)	用地、設計等								★工事	
2.復興まちづくり	3.津波復興拠点	3.市	d 高田南地区	区域面積:18.4ha	用地、設計等								★工事	
2.復興まちづくり	5.まち連携道路	2.県	2 (国)340号 (仮)今泉大橋	-									★工事	R3.12完成目標

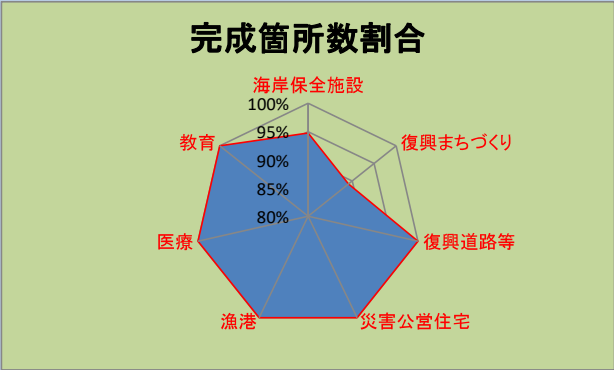

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮)水門N=1基他	H30.9
			2 川原川(曲松)	(災害復旧)護岸工L=3.4km他	H29.3
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧)水門N=1基	R2.3
			4 大野海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	H30.3
			5 石浜海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	H26.3
			6 田の浜海岸	(災害復旧)護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	H25.1
			7 跡本田海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.6km他	H28.3
			8 高田海岸	(災害復旧)防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	H28.12
	農地海岸	県	9 小友海岸	海岸保全施設(災害)防潮堤L=0.6km、水門等N=3基	H30.2
	漁港海岸	市	10 高田松原地区	(治山施設(災害)(防災林造成)防潮林林帯(地盤)L=1.3km	H31.3
			11-1 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.6km	R2.9
			11-2 六ヶ浦(本港地区)	(海岸高潮)防潮堤L=0.2km	R1.10
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.1km	R1.12
			12-2 広田(後浜地区)	(海岸高潮)防潮堤L=0.2km	H31.4
			13 長部漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.7km	R1.12
			14 只出漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.9km	R2.9
			15 根岸漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km	R2.9
			19 栗谷漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km	R2.3
			16 太陽漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H30.9
			17 両替漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.7km	H30.9
復興まち づくり	防災集団 移転	市	e 長部地区(月山)	対象戸数:50戸(民50戸)	H27.8
			f 長部地区(上長部)	対象戸数:17戸(民17戸)	H26.1
			g 長部地区(双六)	対象戸数:12戸(民12戸)	H27.6
			h 長部地区(栗谷)	対象戸数:7戸(民7戸)	H25.12
			i 長部地区(福伏)	対象戸数:5戸(民5戸)	H26.12
			j 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下矢作)	対象戸数:6戸(民6戸)	H26.8
			k 矢作・竹駒・高田・今泉地区(館)	対象戸数:8戸(民8戸)	H26.10
			l 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下沢)	対象戸数:5戸(民5戸)	H27.2
			m 矢作・竹駒・高田・今泉地区(高田)	対象戸数:66戸(民66戸)	H30.7
			n 矢作・竹駒・高田・今泉地区(今泉)	対象戸数:65戸(民65戸)	H30.3
			o 米崎地区(堂の前)	対象戸数:5戸(民5戸)	H25.9
			p 米崎地区(脇の沢)	対象戸数:69戸(民69戸)	H27.10
			q 小友地区(両替)	対象戸数:14戸(民14戸)	H26.4
			r 小友地区(三日市)	対象戸数:5戸(民5戸)	H25.11
			s 小友地区(柳沢)	対象戸数:9戸(民9戸)	H27.3
			t 小友地区(茂里花)	対象戸数:5戸(民5戸)	H27.3
			u 小友地区(新田)	対象戸数:7戸(民7戸)	H26.3
			v 小友地区(只出)	対象戸数:11戸(民11戸)	H26.5
			w 広田地区(長洞)	対象戸数:14戸(民14戸)	H26.6
			x 広田地区(大野)	対象戸数:8戸(民8戸)	H27.2
			y 広田地区(広田大野)	対象戸数:18戸(民18戸)	H27.1
			z 広田地区(田谷)	対象戸数:34戸(民34戸)	H27.3
			aa 広田地区(六ヶ浦)	対象戸数:9戸(民9戸)	H26.6
			ab 広田地区(泊)	対象戸数:25戸(民25戸)	H27.5
			ac 広田地区(中沢)	対象戸数:9戸(民9戸)	H25.12
			ad 広田地区(久保)	対象戸数:7戸(民7戸)	H26.7
津波復興 拠点	まち連携道 路	県	c 高田北地区	(西区)区域面積:9.6ha (東区)区域面積:9.1ha	H28.3 H30.3
			1 (主)大船渡広田 陸前高田線 小友		H30.3
			3 (国)340号 竹駒		H29.3
			4 (主)大船渡広田 陸前高田線 広田町		H29.9
			5 (主)大船渡広田 陸前高田線 久保～泊		R2.8
			6 (主)大船渡広田 陸前高田線 花貝		H28.9
			7 (主)長部漁港線 長部		H27.8

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 高田道路		H26.3
	関連道路	県	A 三陸沿岸道路 唐桑高田道路(唐桑小原木～陸前高田)		H31.3
災害公営 住宅	直接建設	県	B (主)大船渡広田 陸前高田線 太陽		H30.3
			C (一)長部漁港線 長部		H24.8
			A 中田(単独)	RC造8階、戸数:197戸	H27.9
			I 柳ヶ沢(単独)	RC造9階、戸数:301戸	H28.6
			ウ 柳沢前(単独)	RC造3階、戸数:28戸	H27.3
	買取	市	E 脇の沢(単独)	RC造3階、戸数:60戸	H29.6
			カ 下和野(区:高田地区)	RC造7階、戸数:120戸	H26.9
			キ 水上(単独)	RC造7階、戸数:30戸	H26.12
			ク 長部(区:今泉地区)	RC造3階、戸数:13戸	H29.3
			ケ 今泉(区:今泉地区)	RC造3階、戸数:61戸	H29.3
漁港	設計・施工 一括選定	県	コ 大野(単独)	RC造3階、戸数:31戸	H28.3
			サ 田端(単独)	RC造3階、戸数:14戸	H28.3
			オ 西下(単独)	RC造4階、戸数:40戸	H26.12
	漁港	市	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害)防波堤L=601m、岸壁L=474m 他	H28.3
			② 広田漁港	(漁港災害)防波堤L=919m、岸壁L=1,176m 他	H28.3
			③ 長部漁港	(漁港災害)防波堤L=408m、岸壁L=1,180m 他	H28.3
			④ 只出漁港	(漁港災害)防波堤L=332m、岸壁L=298m 他	H28.3
			⑤ 大祝漁港	(漁港災害)防波堤L=99m、岸壁L=43m 他	H28.9
医療	病院	県	⑥ 三陸漁港	(漁港災害)防波堤L=14m、岸壁L=36m 他	H28.12
			⑦ 根岸漁港	(漁港災害)防波堤L=354m、岸壁L=150m 他	H28.3
	医科診療所	市	⑧ 太陽漁港	(漁港災害)防波堤L=332m、岸壁L=79m 他	H28.3
			⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害)防波堤L=136m、岸壁L=183m 他	H28.9
	診療所施設整備	市	⑩ 両替漁港	(漁港災害)防波堤L=274m、岸壁L=254m 他	H29.1
			⑪ 脇の沢漁港	(漁港災害)防波堤L=1,149m、岸壁L=531m 他	H29.1
			⑫ 栗谷漁港	(漁港災害)防波堤L=556m、岸壁L=279m 他	H28.3
教育	高等学校	県	病院(RC造)、合同倉庫(RC造)		H30.1
			国保広田診療所		H29.6
	小学校	市	1 高田高等学校	(災害復旧)校舎、第一体育館、第二体育館、柔剣道場・防災対応施設	H27.3
			2 気仙小学校	(災害復旧)移転	H30.12
	中学校	市	3 高田東中学校	(災害復旧)移転	H28.12



気仙川水門




気仙小学校

社会資本の復旧・復興ロードマップ【内陸市町村 事業中箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

沿岸12市町村以外の工程表【復興道路・復興支援道路、災害公営住宅】

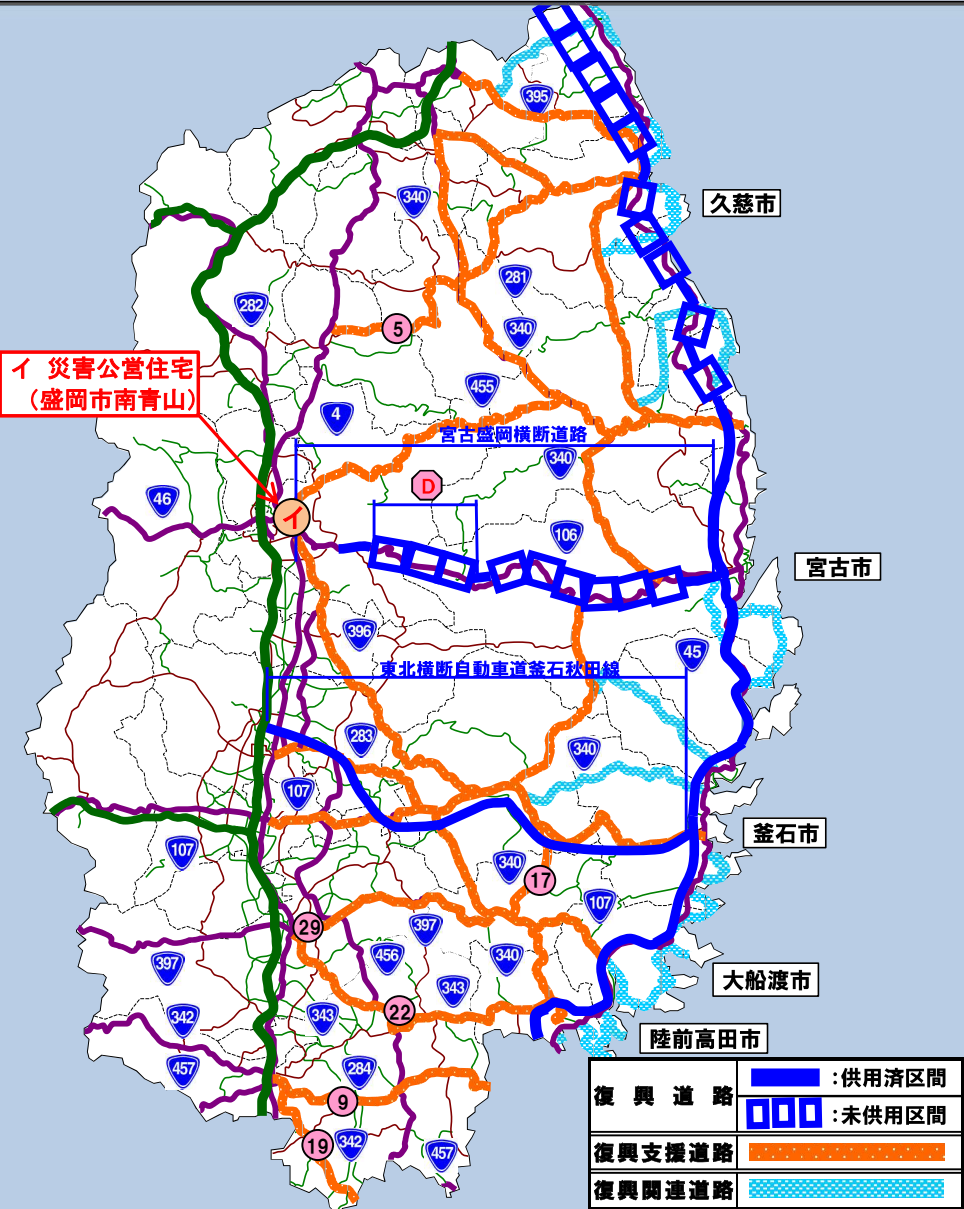

区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール									
						第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる復興への連結期間)		国復興期間			
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
1.直轄事業	1.復興道路	宮古盛岡横断道路	D	宮古市～盛岡市	区界道路 (区界～美川)	◆H26.8.24起工式 ★用地買収、工事等									
2.県事業	2.復興支援道路	国道281号	5	岩手町	大坊の2	◆H27.10起工式 ★用地買収、工事等									
2.県事業	2.復興支援道路	国道284号	9	一関市	石法華	◆H30.6起工式 ★用地買収等を行い、順次工事に着手									
2.県事業	2.復興支援道路	国道340号	17	住田町	栗山～恵蘇	◆H30.7起工式 ★用地買収等を行い、順次工事に着手 R4.3完成目標									
2.県事業	2.復興支援道路	国道342号	19	一関市	白崖	◆H29.10起工式 ★工事 R4.3完成目標									
2.県事業	2.復興支援道路	国道343号	22	一関市	洗民	◆H30.12起工式 ★用地買収、工事等									
2.県事業	2.復興支援道路	国道397号	29	奥州市	小谷木橋	◆H27.9起工式 ★用地買収、工事等 R3.5完成目標									

区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール									
						第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる復興への連結期間)		国復興期間			
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
1.災害公営住宅	盛岡市	2.買収	2.県	イ 南青山 (単独)	戸数:99戸									用地、設計等	工事

社会資本の復旧・復興ロードマップ【内陸市町村 完成箇所】

基準日：令和2年11月10日
(令和2年11月20日公表)

沿岸12市町村以外の工程表【復興道路・復興支援道路、災害公営住宅】

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線名	市町村・箇所名	完成又は 供用開始等時期	
復興道路等	復興道路	国	東北横断自動車道留石秋田線	A 遠野市 遠野住田～遠野	H31. 3	
				B 遠野市 遠野～宮守	H27.12	
		C 遠野市口～花巻市 宮守～東和		H24.11		
		県		宮古盛岡横断道路	R1.12	
				宮古盛岡横断道路	H25. 3	
	復興支援道路	県	一般国道106号RCへアクセスする道路)	1 盛岡市 川目	H25. 3	
				2 奥州市 札幌道路	H23.10	
				3 奥州市 梁川～口内	H31. 3	
				4 岩手町 大坊	H28.12	
				6 遠野市 上郷道路	H28. 3	
				7 一関市 真滝BP	H24. 8	
				8 一関市 室根BP	H30. 4	
				10 遠野市 土淵BP	H25.12	
				11 遠野市(宮古市) 立丸峠	H30.11	
				12 九戸村 泥ノ木	H27. 1	
				13 軽米町 駒板	H28.12	
				14 住田町 山谷	H31. 1	
				15 葛巻町 四日市	H28. 1	
				16 九戸村 長興寺	R1.9	
				18 一関市 花泉BP	H26. 8	
				20 一関市 大原	H26. 3	
				21 一関市 一ノ瀬	H29.12	
				23 軽米町 赤石峠	H28.11	
				24 遠野市 上宮守	R1.12	
				25 住田町 子飼沢	H25. 9	
				26 奥州市 分限城～赤金	H29. 3	
				27 住田町 高屋敷	H29.12	
				28 住田町 津付道路	H26.10	
				(一)遠野住田線RCへアクセスする道路)	30 遠野市 新里	H27.12

分野区分	細分項目等	事業主体	市町村・箇所名	事業概要	完成又は 供用開始等時期
災害公営住宅	直接建設	県	一関市 ア駒下(単独)	RC造、戸数:10戸 木造、戸数:12戸	H31. 3
			盛岡市 イ備後第1①(単独)	RC造、戸数:24戸	H30. 2
			盛岡市 イ備後第1②(単独)	RC造、戸数:18戸	H30. 9
			盛岡市 イ備後第1③(単独)	木造、戸数:8戸	H30. 9
			一関市 ア沢内(単独)	RC造3階、戸数:27戸	H28. 5
		市	花巻市 ウ花巻中央(単独)	RC造、戸数:30戸	H31. 3
			遠野市 才穀町(単独)	木造、戸数:16戸	H30. 9
			遠野市 才稲荷下(単独)	木造、戸数:5戸	R1.7
			一関市 ア横井田(単独)	木造、戸数:13戸	R1.8
			北上市 黒沢尻(単独)	RC造、戸数:34戸	R1.11
	設計・施工一括選定	県	奥州市 力桜屋敷(単独)	木造、戸数:14戸	H31. 3



一般国道340号 長興寺



北上市 黒沢尻 災害公営住宅
